



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

5479/2020

Ao
Departamento de Administração,

Ref.: Notificação Administrativa – Contrato nº 087/2019

• Tomada de Preços nº 012/2019: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1

• Considerando que a Ordem de Serviço para obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1 foi emitida em 03 de Fevereiro de 2020;

• Considerando que a obra ficou paralisada em meados de fevereiro e março em decorrência do período chuvoso;


• Considerando que no fim de março foi solicitado à empresa a paralisação da obra devida a pandemia mundial de COVID-19;


• Considerando que já foi solicitado via e-mail a retomada das obras no dia 22 de abril de 2020, e até a presente data não ocorreu a mobilização da obra;

Solicito que a empresa **CG Engenharia e Construtora Ltda.** seja notificada administrativamente a retomar imediatamente os serviços de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1

P. E. T. S. R. - SERVIÇO DE PROTOCOLO E RESULTADO DE 012-2019-000001/20

São Roque, 29 de Abril de 2020.


Eng.ª Andrezza Tatiane Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

5479/2020

Ao
Departamento de Administração,

Ref.: Notificação Administrativa – Contrato nº 087/2019

• Tomada de Preços nº 012/2019: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1

• Considerando que a Ordem de Serviço para obra de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1 foi emitida em 03 de Fevereiro de 2020;


• Considerando que a obra ficou paralisada em meados de fevereiro e março em decorrência do período chuvoso;

• Considerando que no fim de março foi solicitado à empresa a paralisação da obra devida a pandemia mundial de COVID-19;

• Considerando que já foi solicitado via e-mail a retomada das obras no dia 22 de abril de 2020, e até a presente data não ocorreu a mobilização da obra;

Solicito que a empresa **CG Engenharia e Construtora Ltda.** seja notificada administrativamente a retomar imediatamente os serviços de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1

São Roque, 29 de Abril de 2020.


Eng.º Andreza Tatiane Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034


José Edardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

P. E. T. S. R. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA Nº 17

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SERVIÇOS EXECUTADOS

1ª MEDIÇÃO

PERÍODO:03/02/2020 Á 26/05/2020

2.PLACA DA OBRA

2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO






Andrezza Lima
Eng.ª Andrezza Tatiane Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034

Raphael Castro
Eng.º Civil
CREA 5070439262


3.SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 LOCAÇÃO DE VIAS

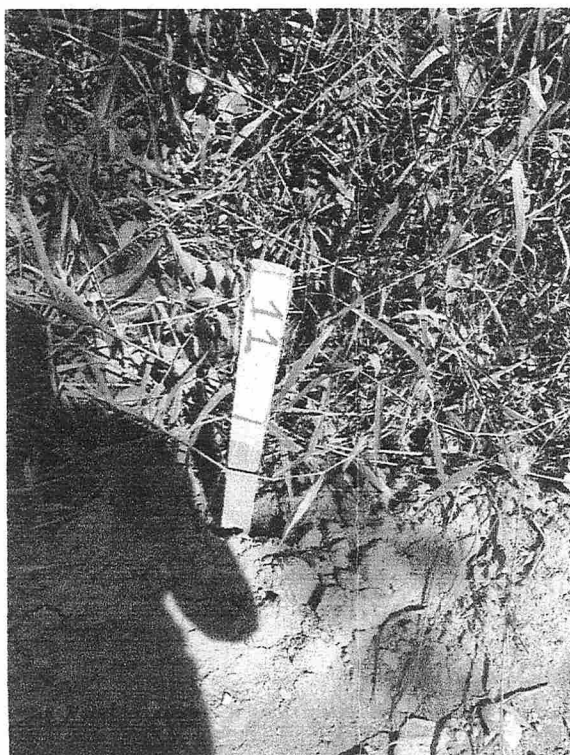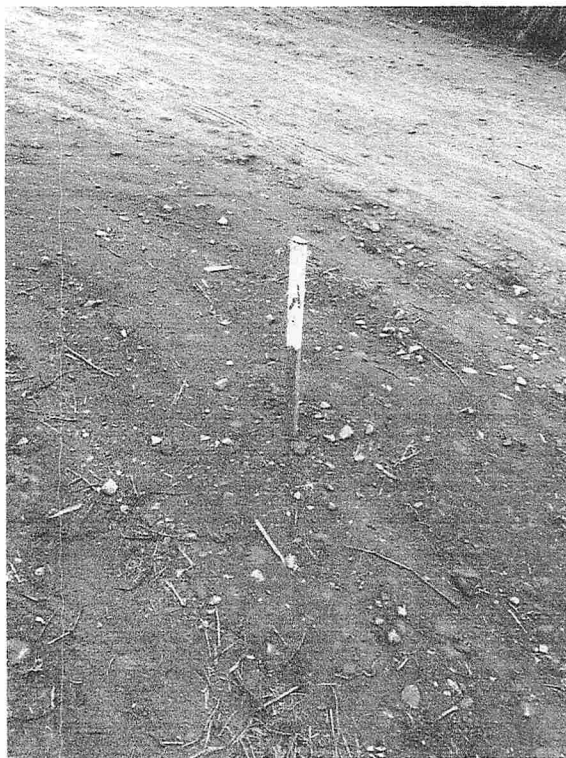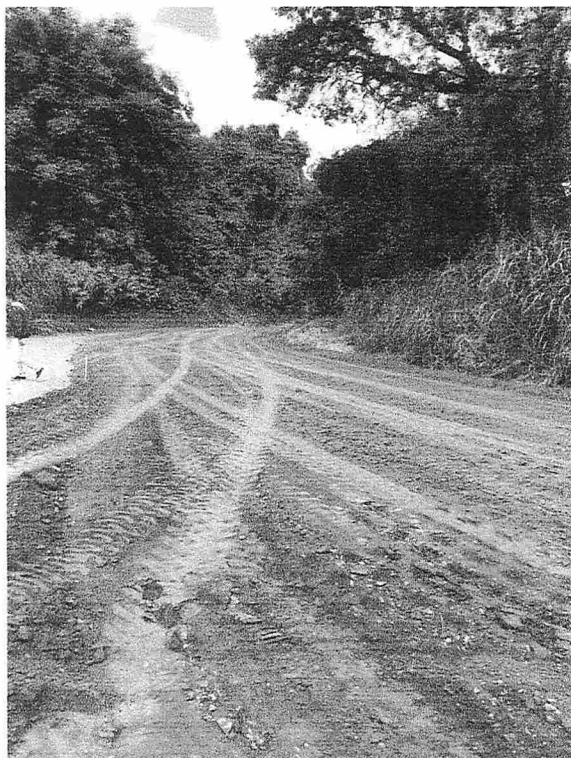




5. DRENAGEM





5.1 ESCAVAÇÃO, TUBOS E LASTRO DE BRITA

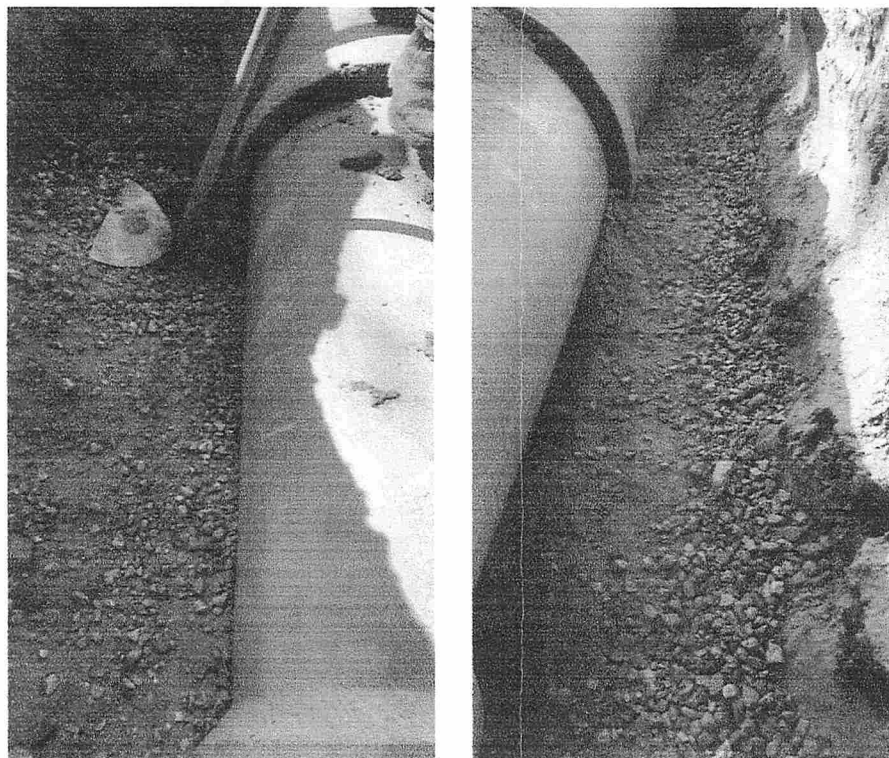

6. PAVIMENTAÇÃO



6.1 COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

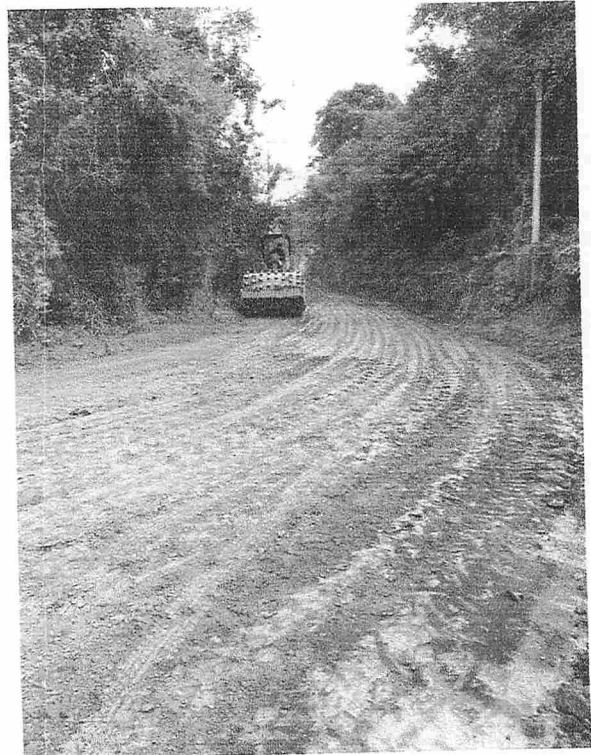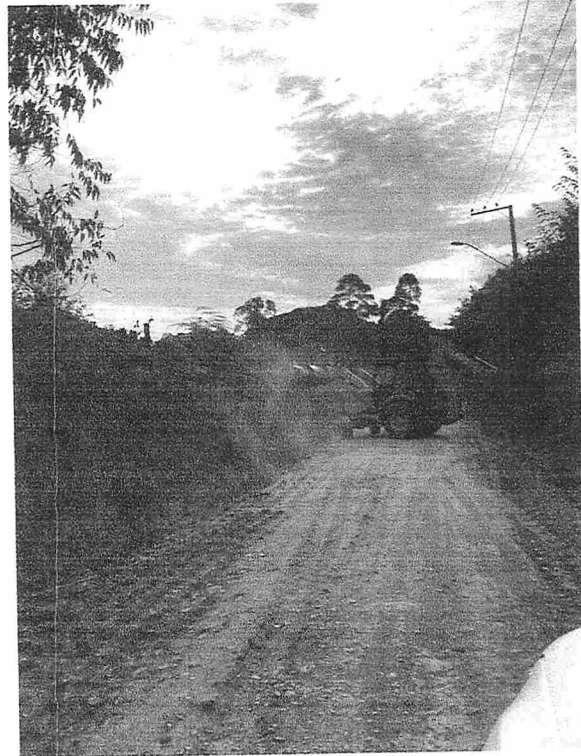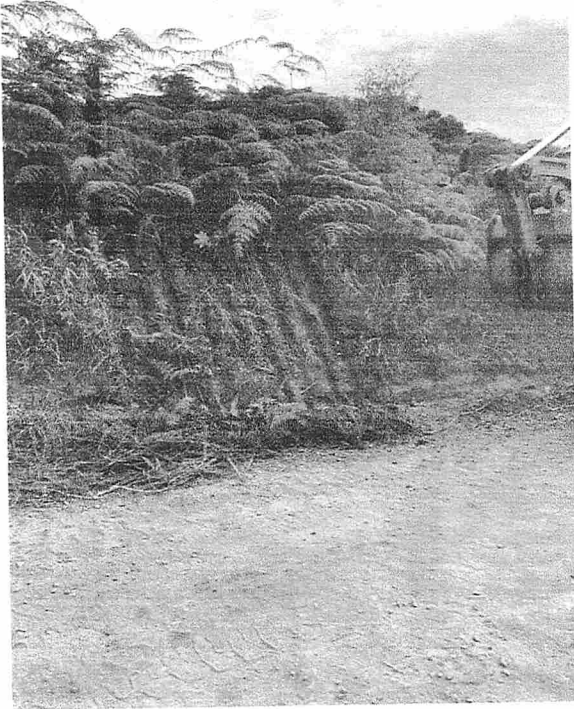

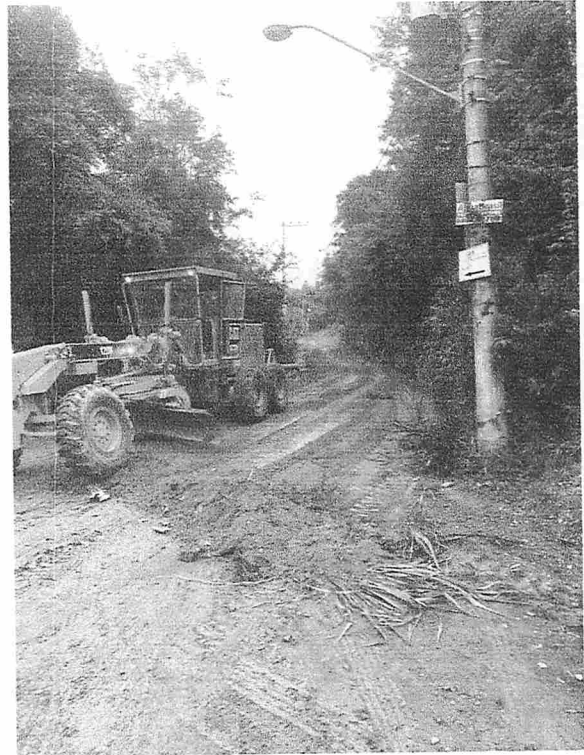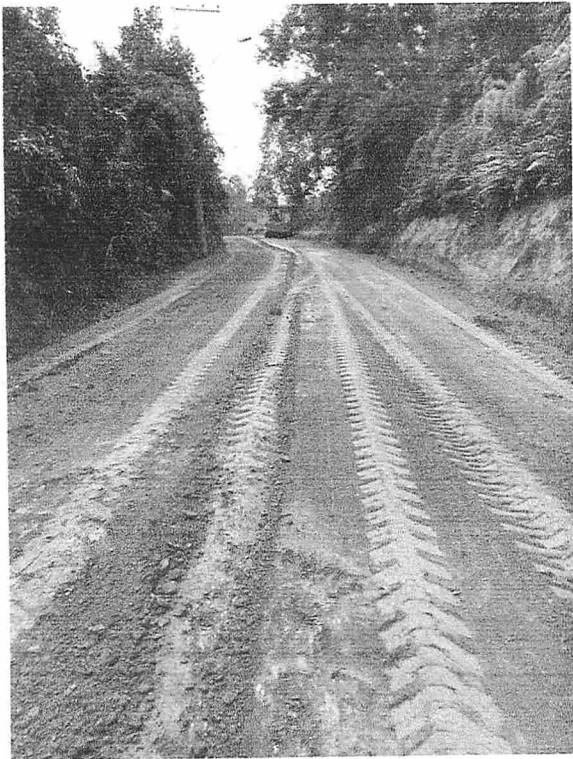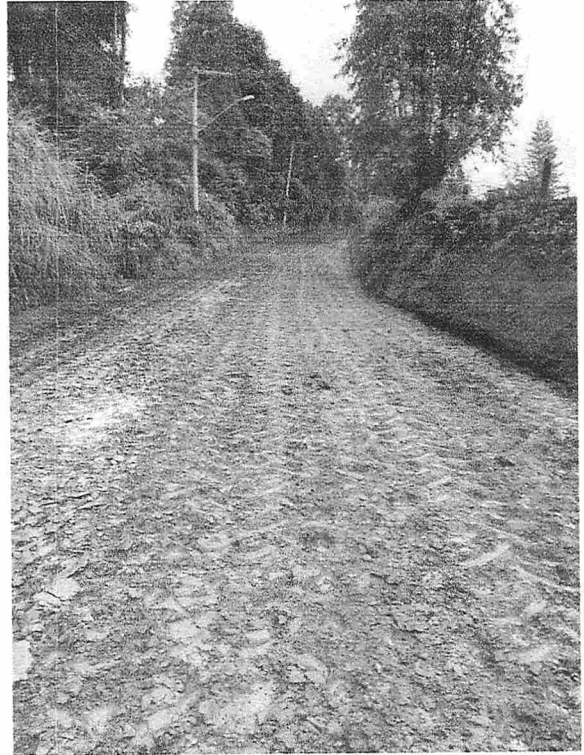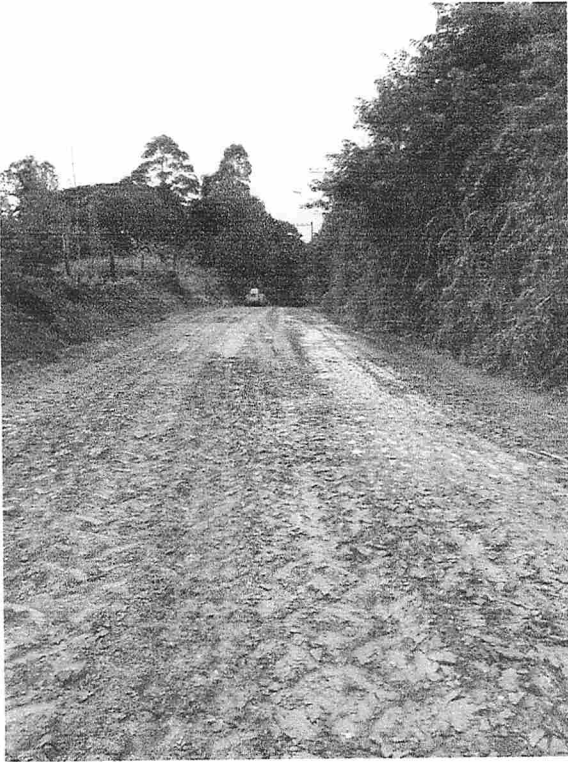

Andreza Lima
Eng.ª Andreza Tatiâne Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034





Raphael Castro
Eng.º Civil
CREA 5070439262

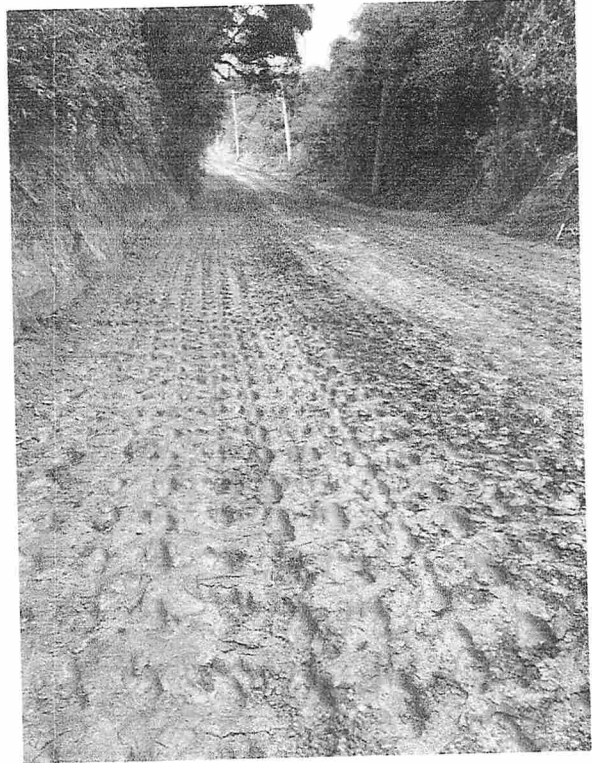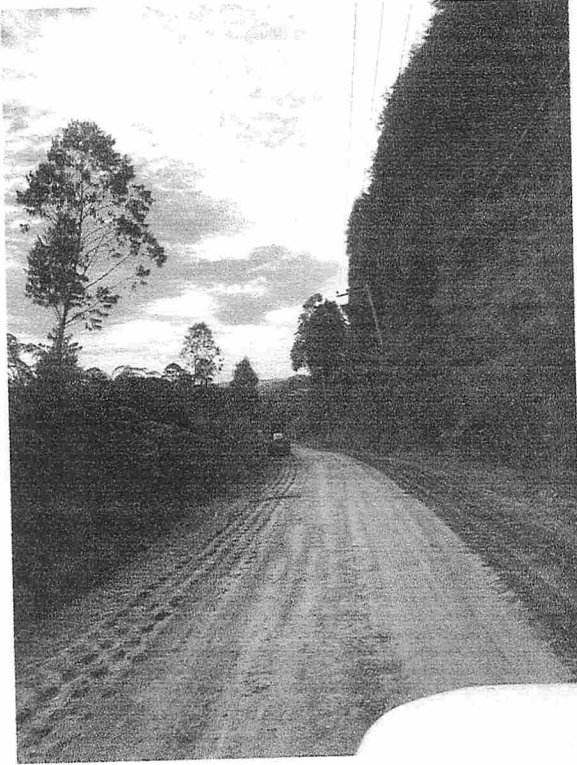

Andreza Lima
Eng.ª Andreza Tatiane Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034

Raphael Castro
Eng.º Civil
CREA 5070439262

6.1 BASE DE BRITA GRADUADA

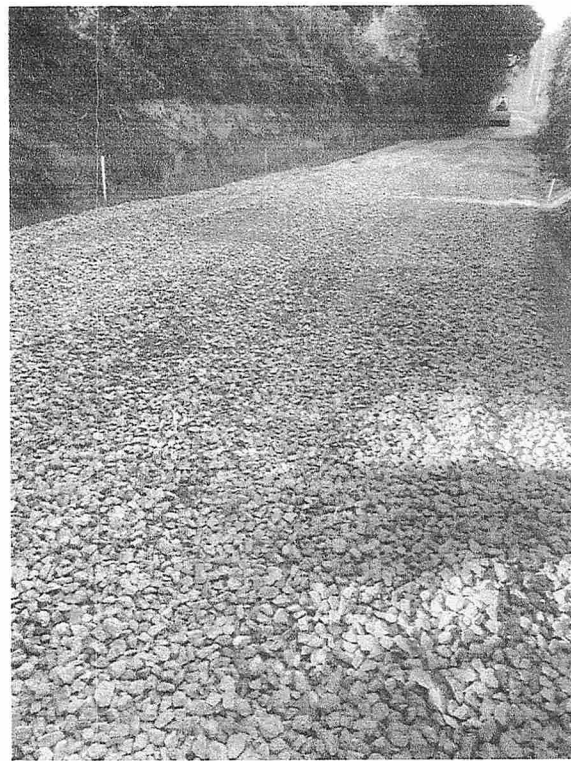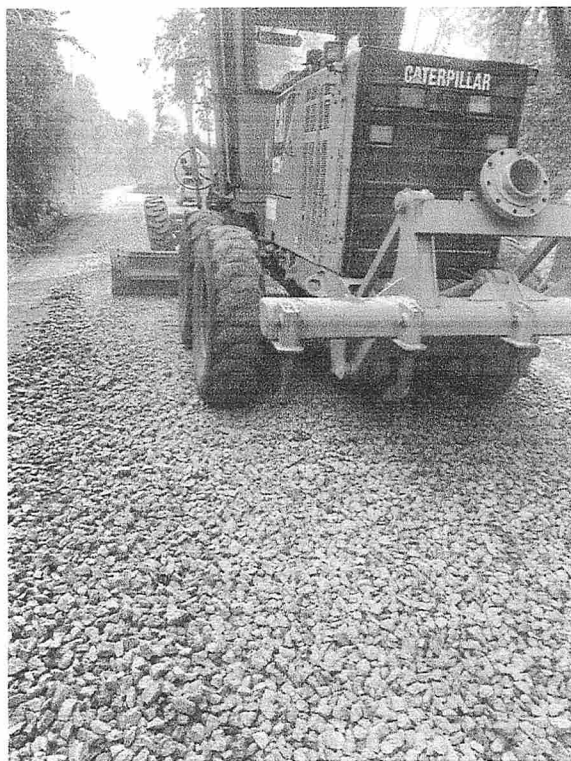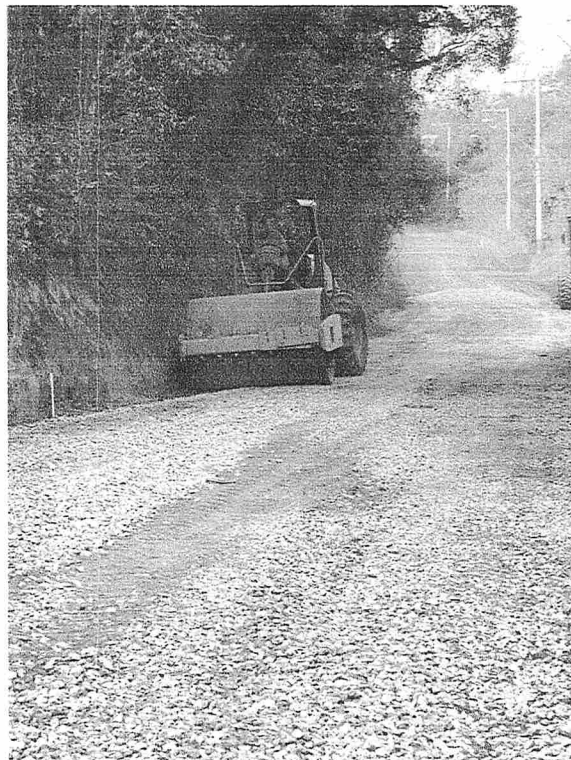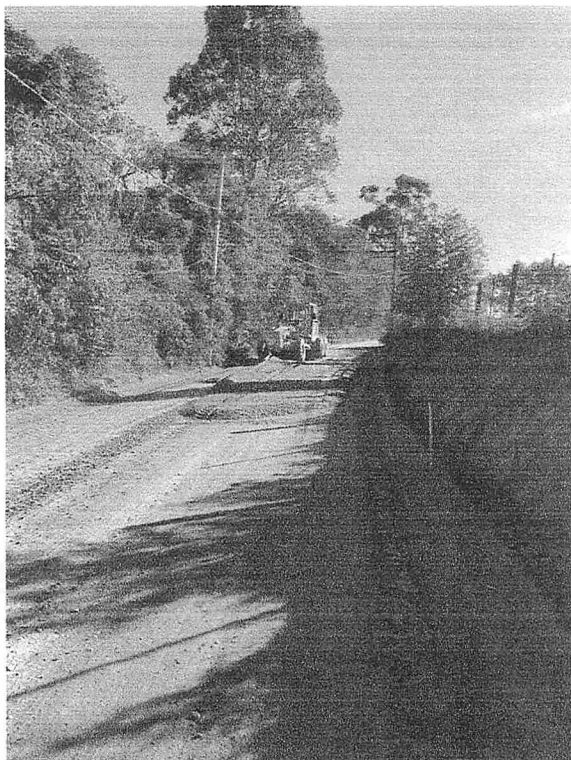

Andrezza Lima
Eng.ª Andrezza Tatiane Maria Lima
Chefe da Divisão de Obras - DPB
CREA-SP 5069644034

Raphael Castro
Eng.º Civil
CREA 5070439262



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"


DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração:

Sra. Diretora:

Conforme informado pela Eng^ª Andrezza,
a empresa retoma a obra no dia 11/05/2020.
Destu forma, favor encerrar a Notificação.
Obrigado,


Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

03/06/2020

2 em 2

para conhecimento e arquivo no processo de
licitação

27.05.2020
Sandra Elisa Scopel Carlini
Diretora do Departamento
de Administração



10744/2021

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração


Notificação Administrativa

Ref.: Tomada de Preços n.º 019/2020

**Ref.: Pavimentação Asfáltica da estrada Turística Angolana e estrada da Cefri-
Fase - 1 do Município de São Roque/SP**

Favor notificar administrativamente a empresa CG Engenharia e Construtora LTDA, a providenciar reparos nos trechos entres as estacas 45 á 52, da pavimentação Asfáltica da estrada Turística Angolana e estrada da Cefri- Fase -1, conforme descrições definidas na documentação na TP 019/2020.

São Roque, 26 de Julho de 2021.


Fredy William Correia Vieira

Engº Civil


Marcos Gianelli de Toledo

Dir. Planejamento e Meio Ambiente



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração


Notificação Administrativa

Ref.: Tomada de Preços n.º 012/2019


Ref.: Pavimentação Asfáltica da estrada Turística Angolana e estrada da Cefri-
Fase - 1 do Município de São Roque/SP

Favor notificar administrativamente a empresa CG Engenharia e Construtora LTDA, a providenciar reparos nos trechos entres as estacas 45 á 52, da pavimentação Asfáltica da estrada Turística Angolana e estrada da Cefri- Fase -1, conforme descrições definidas na documentação na TP 019/2020.

São Roque, 08 de Agosto de 2021.



Fredy William Correia Vieira
Engº Civil



Juliana Caldevilla Bonfiette
Dir. Planejamento e Meio Ambiente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

NOTIFICAÇÃO Nº 027/2021

Protocolo 10744/2021

TP Nº 012/2019

São Roque, 10 de agosto de 2021.

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri - Fase 1, no Município de São Roque/SP.

Prezados Senhores,

Encaminho cópia da manifestação do engenheiro Fredy e da Diretora de Planejamento e Meio Ambiente para que seja providenciado os reparos nos trechos entre as estacas 45 à 52, da pavimentação asfáltica da Estrada Turística Angolana e Estrada da Cefri – Fase 1.

Concede-se à esta empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa escrita.

Outrossim, esclarecemos que as eventuais penalidades cabíveis estão previstas no Contrato e na Lei 8.666/93.

Desde logo, fica autorizado ao interessado vista e extração de cópias dos autos no Setor de Compras, observadas as formalidades legais.

Sem mais, atentamente,


Odair José Silva Aguiar
Diretor do Departamento de Administração

À

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Rua Marino Camurça, nº 30 – Centro

São Roque/SP

CEP: 18.130-515

Fone: (11) 4712-4920

E-mail: comercial@cgconstrutora.com.br

Letícia Moraes - Compras

De: Letícia Moraes - Compras <lmoraes@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de agosto de 2021 10:46
Para: comercial@cgconstrutora.com.br
Assunto: Notificação 027/2021
Anexos: Notificação 027-2021.pdf

À
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Bom dia,

Encaminhamos em anexo Notificação referente a Tomada de Preços 012/2019.

Diante do exposto, concede-se à esta empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa escrita.

Att,



PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SÃO ROQUE
www.saoroque.sp.gov.br

Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho. caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

informações, encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura...

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021
ATA Nº 0555/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021
ATA Nº 0557/21
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021
ATA Nº 0557/21
CONTRATADA: IFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2021
ATA Nº 0558/21
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2021
ATA Nº 0559/21
CONTRATADA: R D VELANI ELÉTRICA EPP

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2021
ATA Nº 0560/21
CONTRATADA: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2021
ATA Nº 0561/21
CONTRATADA: ANTI-BIÓTICOS DO BRASIL LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2021
ATA Nº 0562/21
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACÉUTICA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2021
ATA Nº 0563/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2021
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2021
ATA Nº 0565/21
CONTRATADA: C3 MULTIMARCAS - MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2021
ATA Nº 0565/21
CONTRATADA: A C A EMPREENDIMENTOS LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2021
ATA Nº 0567/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2021
ATA Nº 0568/21
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2021
CONTRATO Nº PRE0106/21
CONTRATADA: CENTRO PSICOTERAPEUTICO VIDA RIO-PRETO EIRELI

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 289/2021
CONTRATO Nº PRE0107/21

CONTRATADA: D & H COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DISPOSITIVOS ELETROELETRONICOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para monitoramento de alarme - SMAS - Helena Cristina Rozales da Silva Morangoni
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R\$96.998,40
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021
CONTRATO Nº PRE108/21
CONTRATADA: IUN UROLOGIA LTDA - EPP

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021
CONTRATO Nº CHP.0005/21
CONTRATADA: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021
CONTRATO Nº CHP.0006/21
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPREPEIRO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 05D5GAF/2021 Objeto: Aquisição de tecido não tecido (TNT) e plástico cristal transparente. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 16/08/2021 às 08h30...

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h03. José Claudio Marcondes Pina - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjpc.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE
Edital de licitação: PE 215/SS/2021. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecedor de Material Hospitalar - Agulha Descartável para Caneta de Insulina. Abertura em 26/08/2021 às 13h30.

Licitações homologadas pela Secretaria de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa. PE 191/SS/2021. Objeto: Aquisição de Cadeiras de rodas e Cadeiras de Banho, nos lotes 1, 3, 5, 6, 8 e 16 e 18. Homologada em 12/08/2021. PE 191/SS/2021. Objeto: Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo IV, nos lotes 1 a 18, 20 e 32. Homologada em 12/08/2021.

Informações: Rua Obidias, 140 - Parque Industrial, Sérgio Salvo - Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjpc.gov.br/salv/licitacoes/edital.aspx

SÃO LOURENÇO DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO
O Departamento de Licitações do Município de São Lourenço da Serra informa que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 12/2021, processo administrativo 2482/2021, tipo menor preço, que objetiva a Aquisição de 01 (um) veículo ambulância, tipo "A", para simples remoção, fabricação nacional, (zero) quilômetro, ano de fabricação não inferior ao de 2021, para o Departamento de Saúde do Município de São Lourenço da Serra, conforme edital e seus anexos. O credenciamento, nos protocolos, dos representantes das licitantes será no dia 26 de agosto de 2021 às 09:00 horas. Abertura do envelope proposta e envelope documentos será na data de 26 de agosto de 2021, às 09:30 horas. O edital em seu inteiro teor está à disposição dos interessados no site da Prefeitura. Podendo, também, ser consultado na sede da municipalidade, no endereço Rua Ouedina Mana de Camargo, 422, Centro. São Lourenço da Serra/SP. CEP 06880-000, no horário compreendido das 9h às 12h e das 13h às 16h. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, no e-mail licitacao@saoluourenco.sp.gov.br ou pelo telefone 11-4687-1065. Felipe Geleferon Seme Amold - Prefeito interino. Luiz Paulo de Lima - Pregeiro. São Lourenço da Serra, 12 de agosto de 2021.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 038/2021 - PROC. ADM. 0567/2021 - EDITAL 050/2021 - NO DIA 12/08/2021, DEPOIS DE CONSTATADA A REGULARIDADE DOS ATOS PROCEDEMENTAIS, A AUTORIDADE COMPETENTE, ANA LUCIA R. SICHERLE, PREFEITA, HOMOLOGOU O ITEM 01 DO PREGÃO ELI. EPÍGRAFÉ PARA A EMPRESA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42. FICA A EMPRESA CONVOCADA A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DE ATÉ 05 DIAS ÚTIS A PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

AVISO DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº. 20/2021

Processo Administrativo nº 3409/2021. O Prefeito do Município de São Manuel, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo de Dispensa de Licitação nº 20/2021, que tem por objeto a aquisição de refeições prontas, uso "matutino", visando atender as necessidades da Guarda Municipal e das Direções pertencentes a Prefeitura de São Manuel tendo como contratada a empresa PATRÍCIA PEREIRA TORRES ALIMENTOS ME pelo valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por prazo de 12 meses, com fundamento previsto no art. 24-V da Lei de Licitações nº 8.666/93. São Manuel, 12 de agosto de 2021. Ricardo Salazar Neto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 4787/2019
- Dispensa de Licitação nº: 17/2019 - Contrato Aditado: 17/2019 - Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE FIDELIDADE - OSE FIDELIDADE, CNPJ/MF: 51.804.771/0001-77. Objeto: Aditivo ao contrato para promoção de prazo e valor cujo objeto é a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social na área de saúde, no âmbito do município de São Manuel para prestação de serviços em Unidade de Saúde tendo como objetivo a gestão, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde de acordo com as especificações, o quantitativo, e regulamentação do gerenciamento e a execução de atividades e serviços de saúde. Prazo: 01/08/2021 a 31/07/2022. Valor Total: R\$ 178.213,12.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Prazo: 01/08/2021 a 31/07/2022. Valor Total: R\$ 4.403.453,28.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº: 2389/2020
- Inexigibilidade nº: 12/2020 - Contrato Aditado: 64/2020 - 2º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04. Objeto: Aditivo ao contrato para suprimento de valores cujo objeto é a prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas por terceiros, mediante a emissão de D.A.M., em caráter FÉRRIBAN, das suas dependências e suas filiais, e suas dependências operacionais por meio de seus bancos e outros canais. Prazo: 01/08/2021 a 31/07/2022. Valor Total: R\$ 190.237,80.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2021 - PROCESSO Nº 9382/2021
Refletida do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 31/2021, do tipo menor preço por Km, referente as Linhas 23, destinada a seleção de propostas mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte de alunos às escolas localizadas neste Município de São Miguel Arcanjo. Edital através de correspondência eletrônica (email), Arquivo Edital através de https://compraslicitacao.sp.gov.br ou encaminhados para compras@compraslicitacao.sp.gov.br ou e-mail: compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 26 de setembro de 2021. Informações: às 9:00 às 16:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, nº 53, Centro, SMA, Tel/Fax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 12 de agosto de 2021. Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO DO TURVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2021
OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições de material eletrônico e de informática, destinado ao Município de São Pedro do Turvo.
Recebimento das propostas: até o dia 27 de Agosto de 2021, às 08h00min.
Início da sessão de disputa de lances: 27 de Agosto de 2021, às 09h00min.
Local: http://bill.org.br/ Acesso Identificado".
Maiores informações: Departamento de Compras e Licitação - Rua Gasca Braga, 93 Centro, São Pedro do Turvo/SP, site: http://www.saopedrodoturvo.sp.gov.br

Município de São Pedro do Turvo, 12 de agosto de 2021
MARCOS AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - Ref: Pregão Eletrônico nº. 068/2021 - Registro de preços para aquisição de Material de Construção (Beto e Guia e Concreto) a serem utilizados pelo Departamento de Obras desta Prefeitura. Em 12/08/2021 o Sr. Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito e homologou o item 01 a empresa INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTE-FATOS DE CIMENTO EMERICI EIRELI, pelo valor total de R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); os itens 02 e 03 restaram fracassados. Prazo de entrega: 12 dias úteis. **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021** - Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angelana e Estrada da Celn - Fase 1, no Município de São Roque/SP. Fica a empresa CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA notificada para que ao prazo de 05 (cinco) dias úteis apresente defesa por escrito. E fica autorizada ao interessado vistas e extração de cópias dos autos, observadas as formalidades legais.

RESUMO DE EDITAL - PE Nº 075/2021 - Registro de preços para aquisição de medicamentos para o Departamento de Saúde - Encerramento às 08h45 horas do dia 08/05/2021. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 17/08/2021, no site www.saoroque.sp.gov.br
RESUMO DE EDITAL - PE Nº 070/2021 - Registro de Preço para aquisição de material sulfite para diversos Departamentos - Encerramento às 08h45 horas do dia 05/05/2021. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 17/08/2021, no site www.saoroque.sp.gov.br
RESUMO DE EDITAL - PE Nº 071/2021 - Registro de Preço para aquisição de uniformes camiseta, bone e botas para atender as necessidades da Guarda Municipal e das Direções pertencentes a Prefeitura de São Manuel tendo como contratada a empresa PATRÍCIA PEREIRA TORRES ALIMENTOS ME pelo valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por prazo de 12 meses, com fundamento previsto no art. 24-V da Lei de Licitações nº 8.666/93. São Manuel, 12 de agosto de 2021. Ricardo Salazar Neto - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº: 2389/2020
- Inexigibilidade nº: 12/2020 - Contrato Aditado: 64/2020 - 2º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04. Objeto: Aditivo ao contrato para suprimento de valores cujo objeto é a prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas por terceiros, mediante a emissão de D.A.M., em caráter FÉRRIBAN, das suas dependências e suas filiais, e suas dependências operacionais por meio de seus bancos e outros canais. Prazo: 01/08/2021 a 31/07/2022. Valor Total: R\$ 190.237,80.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº: 2389/2020
- Inexigibilidade nº: 12/2020 - Contrato Aditado: 64/2020 - 2º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04. Objeto: Aditivo ao contrato para suprimento de valores cujo objeto é a prestação de serviços bancários de cobrança visando a arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas por terceiros, mediante a emissão de D.A.M., em caráter FÉRRIBAN, das suas dependências e suas filiais, e suas dependências operacionais por meio de seus bancos e outros canais. Prazo: 01/08/2021 a 31/07/2022. Valor Total: R\$ 190.237,80.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA Nº 3387/2017
- Dispensa de Licitação nº: 38/2017 - Contrato Aditado: 102/2017 - 14º Termo Aditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - CNPJ/MF: 46.534.523/0001-90. Contratada: IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO - HOSPITAL DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ/MF: 60.332.673/0001-70. Objeto: Aditivo ao contrato para prorrogação de prazo e valor cujo objeto é a administração e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências do Pronto Socorro, dentro da sua capacidade resolvente e operacional. Valor Total Aditado: R\$ 204.333,08.

seputadores dos cemitérios para atender o Departamento de Obras - Encerramento às 08h45 horas do dia 10/09/2021. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 17/08/2021, no site www.saoroque.sp.gov.br
RESUMO DE EDITAL - PE Nº 076/2021 - Registro de preço para aquisição de material médico hospitalar para o Departamento de Saúde - Encerramento às 08h45 horas do dia 14/09/2021. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 17/08/2021, no site www.saoroque.sp.gov.br
RESUMO DE EDITAL - PE Nº 098/2021 - Aquisição de máquina de pintura visada para atender a Divisão de Transportes - Encerramento às 08h00 horas do dia 13/09/2021. O edital encontra-se a disposição a partir do dia 17/08/2021, no site www.saoroque.sp.gov.br

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - Processo Administrativo nº 1104/2021 - Ebas Barbosa Santos - Valor: R\$ 917,05 - referente a indenização proveniente do pagamento de multa da Sia, Jaqueline Bernardo dos Santos. Beneficiária do programa auxílio aluguel instituído por meio da Lei Municipal nº 3.504/2010. Assinatura: 10/08/2021.
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - Ref. Pregão Presencial nº. 003/2021 - Contratação de empresa para a prestação de Serviços de instalação de aparelhos de Ar Condicionado de 12000 BTUs e 18000 BTUs para unidades de saúde do Município de São Roque. Encerramento às 08h45 horas do dia 02/08/2021. O Sr. Pregoeiro homologou a decisão proferida pelo Pregoeiro que adjudicou os itens 1 e 2 a empresa FXR AR CONDICIONADO SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP pelo valor total de R\$ 8.517,30 (oito mil quinhentos e dezesseis reais).

EXTRATO DE ATA Nº 232 - PREGÃO ELETRÔNICO 045/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI LTDA - ITEM 1 - 500 SE. Serviços de confecção, fornecimento de placas de vias públicas e instalação e material incluído, sendo: placas em aço galvanizado de 10x10x3mm, espessura de 1,25mm, com tratamento antirreflexivo, anticorrosivo com pintura de fundo eletrolítica na cor azul, medindo 50mm por 330mm - postes pp, de sustentação de placas de trânsito em ferro galvanizado, medindo no mínimo 3,60mm x 2 7/8" de diâmetro, 3,0mm de espessura, com aberturas inferior achatada e o topo vedado com tampão - aberturas para postes de sinalização de identificação de vias públicas, compatível com o poste tipo pp, medindo no mínimo 2 7/8" de diâmetro, confeccionadas em ferro galvanizado, com dupla fixação de placa e com sistema de montagem independente, onde a fixação da

Leticia Moraes - Compras

De: CG Comercial <comercial@cgconstrutora.com.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de agosto de 2021 09:25
Para: lcmoraes@saoroque.sp.gov.br; engenharia3@cgconstrutora.com.br
Assunto: RES: Notificação 027/2021
Anexos: RESPOSTA NOTIFICAÇÃO 027.2021.pdf

BOM DIA!!

Segue em anexo resposta referente a Notificação nº 027.2021.

Qualquer dúvida estarei a disposição.

Sem mais,

Atenciosamente,

Claudenice A. Duarte Fraga

Depto de Licitações

(11) 4712-4920/3329

(011) 94794-3178 – (15) 996049343

comercial@cgconstrutora.com.br

De: Leticia Moraes - Compras [mailto:lcmoraes@saoroque.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 12 de agosto de 2021 10:46
Para: comercial@cgconstrutora.com.br
Assunto: Notificação 027/2021

À
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Bom dia,

Encaminhamos em anexo Notificação referente a Tomada de Preços 012/2019.

Diante do exposto, concede-se à esta empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa escrita.

Att,



PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SÃO ROQUE
www.saoroque.sp.gov.br

Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório

Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



A empresa **CG Engenharia & Construtora LTDA**, com sede social e administrativa localizada a Rua Marino Camurça, 30 – Centro, São Roque/SP – CEP 18130-515, inscrita no CNPJ: 71.847.677/0001-08 e inscrição municipal nº10492, vem através deste, esclarecer os fatos e manifestar defesa sobre as obras de Pavimentação e Drenagem da Estrada da Angolana Fase 1:

Como é de conhecimento de todos, a obra supracitada que foi executada por nossa equipe, dispunha de um mesmo projeto de pavimento (“Pavimento tipo”, assim chamado pelo corpo técnico dos engenheiros responsáveis pela prefeitura na época) independente do tipo de base existente ou qualquer estudo preliminar que identifique possibilidade de reforços de base.

Em 3 de Fevereiro de 2020 demos início nos serviços da Estrada Turística da Angolana, seguindo rigorosamente as exigências de projeto e boas práticas executivas. Realizamos a regularização e compactação da base existente sob a supervisão da Engenheira Andreza Lima. Tal serviço mesmo sendo bem executado não abrange camadas mais profundas do subleito, o que torna vulnerável a vida útil do pavimento caso alguma instabilidade venha a ocorrer.

Tudo correu bem durante a fase de regularização e compactação da base existente, com exceção de apenas um trecho em que detectamos a necessidade de reforço pois o solo se apresentava muito instável apenas com o trânsito local (solo borrachudo).

O trecho em questão foi testado mais de uma vez e após a confirmação do problema por parte da engenheira responsável, o contrato foi aditado e o reforço executado.

Vale ressaltar que a obra foi executada em período de estiagem e após concluída em outubro de 2020, não apresentou nenhum problema no pavimento. Porém no início de 2021, fomos solicitados pelo novo diretor Ramon e o novo engenheiro responsável Fredy Vieira, para verificar graves defeitos no pavimento. Em visita ao local, nos espantou a gravidade dos danos encontrados, pois havíamos seguido rigorosamente os projetos e naquele trecho não tinha sido detectado nenhuma necessidade de reforço.

No mesmo período, já numa segunda visita às obras em conjunto com o Engenheiro Fredy, um morador local, residente no bairro há mais de 40 anos, nos informou que ali naquele trecho corriam 2 minas d’água e que na época de chuvas, as águas vertiam na pista de rolamento e nos barrancos em volta.

CG Engenharia e Construtora Ltda
CNPJ 71.847.677/0001-08


Raphael Castro
Engº Civil
CREA 5070439262



Novamente constatado um problema na base do pavimento, sem nenhuma previsão em projeto, a CG novamente se prontificou a executar os reforços caso a prefeitura fornecesse os materiais necessários, porém após esta proposta a prefeitura não mais nos procurou.


Ressaltamos que as obras da Estrada da Angolana Fase 1, se encontram com pendência de pagamento por parte da prefeitura há mais de 10 meses após a sua entrega. Já entramos em contato com o setor de convênios inúmeras vezes e nenhuma explicação é dada, assim como nas Obras de Pavimentação e Drenagem da Rua Natarula com a última medição atrasada há mais de 9 meses e da Estrada Achilles Augusto há mais de 4 meses.

INFORMAMOS QUE OS ENSAIOS TECNOLOGICOS E SONDAgens SERÃO REALIZADOS NO LOCAL AINDA ESTA SEMANA AFIM DE COMPROVAR TAL DEFESA. REFORÇAMOS QUE NÃO NOS NEGAMOS A EXECUTAR QUALQUER TIPO DE REPARO DESDE QUE O MESMO SEJA PROVENIENTE DE FALHA EXECUTIVA OU VICIOS MATERIAIS CONFORME PREVISTO EM CONTRATO E NA LEI 8.666/93.


CG ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA

Engº Raphael Castro

Raphael Castro
Engº Civil
CREA 5070439262


CG Engenharia e Construtora Ltda
CNPJ 71.847.577/0001-08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Ref. Tomada de Preços nº 012/2019

Assunto. Notificação 027/2021

Em 12/08/2021 foi encaminhada via e-mail e em 13/08/2021 publicada na IOE a **notificação 027/2021** à empresa **CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**

Da data da publicação foi concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa escrita.

Foi apresentada defesa escrita à notificação que segue encartada.

Diante do exposto, encaminho processo para conhecimento e no caso de eventual aplicação de sanções, favor indicar a penalidade e atribuir seu valor nos termos do TP 012/2019.

Sem mais,

São Roque, 17 de agosto de 2021.


Odair José Silva Aguiar

Diretor do Departamento de Administração



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
São Roque – 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

A/C Eng. Fredy Vieira

Ref. TP nº 012/2019

Assunto: Notificação 027/2021

Conforme solicitado, segue planilha com os valores pagos e valores a pagar. Sendo os valores a pagar provenientes do Estado que ainda não foram repassados ao município.

Objeto	Valor Licitado	Pago	A Pagar
Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana e da Estrada da CEFRI - Fase 1	R\$ 1.454.494,38	1a. parcela: R\$ 343.587,59 - 07/2020 2a. parcela: R\$ 443.496,15 - 10/2020 3a. Parcela: R\$ 57.130,45 - 12/2020	R\$ 668.210,64
Pavimentação Asfáltica da Estrada Turística Angolana - Fase 2	R\$ 1.248.815,00	1a. parcela: R\$ 270.486,75 - 07/2019 2a. parcela: R\$ 372.473,35 - 10/2019 3a. parcela: R\$ 327.409,48 - 08/2020	R\$ 310.344,29
Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Domingos Natarula (SALDO DA ANGOLANA 2)			
Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Estrada Achilles Augusto de Moraes, Bairro do Sorocamirim	R\$ 576.318,76	1a. parcela R\$ 127.971,05 - 10/2020	R\$ 446.747,11
			R\$ 1.425.302,04

Sem mais,

São Roque, 14 de setembro de 2021

Haysa Stephani Tigre de Sousa
Chefe de Divisão do Depto. de
Planejamento e Meio Ambiente
CREA 5070456237

HAYSA S. TIGRE DE SOUSA

Chefe de Divisão do Depto de Planejamento e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Despacho	Protocolo nº 10744/2021
	Data: 13/10/2021

Identificação da Entidade

Nome	CPF/CNPJ
CG Engenharia e Construtora LTDA	71.847.677/0001-08
Assunto: Notificação Administrativa	

Ao Engº Fredy

Como solicitado, pelo Engenheiro Fredy foi realizado pela equipe do Meio Ambiente vistoria técnica para verificar quanto a possível nascente ou recurso hídrico existente no local da implantação de asfalto na via denominada Estrada da Angolana.

Esteve presente na vistoria o senhor Engº Fredy e o Engº Adriano Ito, onde foi verificado locais úmidos próximo aos injurias no asfalto, não foi possível verificar de onde vem a água.

A região onde foi aplicada a massa asfáltica que possui certas injurias não possui água correte próximo, verificado pelo sistema Datageo, verificou-se que não existe nenhum corpo hídrico no local.

A empresa CG engenharia e Construtora Ltda demonstraram atrás de análise de solo que as amostras são praticamente secas, não sendo possível verificar existência de água constante no local.

Engº Amb. Adriano Ito dos Santos

Chefe de Divisão do Meio Ambiente

CREA: 5069408742

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

Ao Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Ref. Tomada de Preços n.º 012/2020 - Contratação de empresa para execução de obras de reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na avenida 16 de agosto, no município de São Roque/SP.

Em resposta ao Requerimento nº 030/2020, informamos;

2) Preste esclarecimentos sobre relativas à Obra de Reforma da Pista de Caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto, encaminhando e explicando, entre outras coisas:

Resposta:

a) As justificativas encontram-se nos autos do processo, estando a disposição para eventuais consultas.

São Roque 30 de março de 2022.



Vinícius José Camargo Piccirillo
Diretor do Departamento de Administração

Ao Departamento de Planejamento

Ref. Requerimento 030/2022

Em resposta ao item 2 – j do Requerimento 030/2022 de autoria da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, informo que não há ação judicial movida, pelo Município de São Roque, em face da empresa Santenge.


São Roque, 31 de Março de 2022.

Fabiana Marson

Diretora Departamento Jurídico



Fabiana Marson
OAB/SP 196.742



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

À,

Eng^a Juliana Caldevilla – Diretora do Planejamento

Ref.: Protocolo nº14565/2021 no qual requer informações sobre a conclusão da obra da pista de caminhada da Av. 16 de Agosto.

Objeto: TP nº12/2020: “Reforma da Pista de Caminhada e Infraestrutura de iluminação Pública na Av. 16 de Agosto.

Prazo de entrega da obra: 90 dias

Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli

Segue abaixo um breve histórico da obra:

1. O Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura da Estância Turística de São Roque e a empresa Santenge Construções e Serviços Ltda, vencedora da TP 012/2020, foi lavrado em 14/10/2020, e a Ordem de Serviço foi expedida em 04/11/2020.

2. A empresa iniciou a mobilização e em conjunto com a fiscalização da Prefeitura, definimos executar a obra em duas etapas, sendo um lado de cada vez para não causar muitos transtornos aos munícipes.

3. Definimos em reunião na Prefeitura a necessidade de elaboração de um aditivo de serviços não previstos na planilha orçamentária e necessários para a conclusão da obra. Em 26/11/2020 foi encaminhado para o Eng^o Pedro da Santenge a análise do aditivo proposto pela empresa.

4. Medições:

- Em 10/12/2020 foi aprovada a 1^a medição referente ao período de 04/11/2020 a 30/11/2020 com 8,12% dos serviços executados;

- Em 21/01/2021 foi aprovada a 2^a medição referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020 com 2,55% dos serviços executados;

- Em 26/02/2021 foi aprovada a 3^a medição referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021 com 12,10% dos serviços executados;

- Em 12/04/2021 foi aprovada a 4^a medição referente ao período de 01/02/2021 a 31/03/2021 com 34,49% dos serviços executados;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- Em 28/04/2021 foi aprovada a 5ª medição referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021 com 13,06% dos serviços executados.

- Total dos serviços executados: 70,32%

5. Notificações:

- 1ª notificação administrativa solicitada em 18/01/2021 devido à execução lenta dos serviços, bem como a falta de materiais e planejamento para a conclusão da obra.

- 2ª notificação administrativa solicitada em 17/05/2021 devido a obra parada.

- Em 03/06/2021 foi solicitada a aplicação de penalidade à empresa devido à interrupção das atividades.

- Em 25/08/2021 foi solicitado ao Departamento Jurídico um parecer em relação ao contrato, pois a obra continua parada.

6. Comunicações via e-mail:

- 26/11/2020: e-mail encaminhando a memória de cálculo do aditivo após a análise.

- 08/12/2020: e-mail cobrando resposta do aditivo.

- 14/01/2021: e-mail informando que somente 2 funcionários estão trabalhando na obra.

- 15/01/2021: devolução da memória de cálculo do aditivo após a análise da nova versão da memória de cálculo.


- 29/01/2021: e-mail cobrando a resposta da análise da memória de cálculo.

- 02/02/2021: envio pelo Engº da empresa, nova versão do aditivo para análise.

- 03/02/2021: devolução da memória de cálculo após análise.

- 08/02/2021: envio pelo Engº da empresa da 3ª versão da memória de cálculo para análise.

- 11/02/2021: envio pelo Engº da empresa da 4ª versão da memória de cálculo para análise.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- 12/02/2021 as 09:07h: devolução da memória de cálculo do aditivo 4ª versão após a análise.
- 12/02/2021 as 11:40h: envio pelo Engº da empresa dos documentos do aditivo após análise.

18/03/2021: envio da memória de cálculo pelo Engº da empresa para análise após serviços solicitados para acerto do nível do terreno.

7. Em 03/09/2021 houve uma reunião na Prefeitura com os representantes da empresa, o fiscal da obra e o Dr. Vinícios, para a retomada da obra, haja vista que, faltam aproximadamente 30% para conclusão. Mas a empresa informou que não tem condições de terminar a obra devido à alta dos preços dos materiais em função da pandemia do COVID - 19.

CONCLUSÃO:

Como podemos verificar, para uma obra com prazo de 3 meses de execução, a empresa não se planejou. Por várias vezes foi alertada tanto verbalmente, por e-mail como por via administrativa sobre o ritmo lento da obra.

O aditivo foi aprovado após várias versões apresentadas, talvez por falta de conhecimento real da obra.


Em reunião na Prefeitura no dia 03/08/2021, os representantes da empresa alegaram que devido à pandemia os preços dos materiais subiram muito, inviabilizando a obra.

O que aconteceu realmente foi que a empresa não cumpriu com o cronograma, estando sujeita às penalidades previstas em contrato. O processo está com o Jurídico para as devidas providências.

Caso haja a rescisão contratual acompanhada da multa, o processo deverá retornar para o Planejamento para elaboração de novo orçamento e licitação para a conclusão da obra.

Segue anexo, cópia das solicitações das notificações, cópia dos e-mail's, Relatório de Acompanhamento de Obra demonstrando os pagamentos e saldo, bem como os serviços executados em cada medição. Todos os serviços executados foram pagos.

São Roque, 04 de Novembro de 2021.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração
De: DPP – Divisão de Planejamento

1º ADITAMENTO - PRAZO

Ref.: TP 012/2020 – Reforma da Pista de Caminhada e Implantação
de Iluminação Pública
Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli
O.S.: 04/11/2020
Contrato nº 061/2020

Considerando que, devido à pandemia que estamos vivendo em função da COVID-19, há uma escassez de materiais de construção civil;

Considerando que, a fiscalização em conjunto com a empresa decidimos executar a obra em duas etapas para não impactar o trânsito de veículos e a circulação de pedestres;

Sendo assim, solicito o aditamento de prazo do contrato para mais 60 dias, ficando os seguintes vencimentos:

- Contrato: 12/04/2021
- Ordem de Serviço: 03/04/2021

São Roque, 04 de Janeiro de 2021.

ITEM "B"



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração
De: Planejamento de Meio Ambiente

2º ADITAMENTO - VALOR

Ref.: TP 012/2020 – Reforma da Pista de Caminhada e Implantação
de Iluminação Pública
Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli
O.S.: 04/11/2020
Contrato nº 061/2020

O contrato n. 061/2020 tem como objeto a contratação de empresa para Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública.

Durante o decorrer da obra constatou-se que diversos itens não constam na planilha orçamentária, tais como canteiro de obras(banheiro químico, container para depósito); Reforma do sistema de drenagem da Av. 16 de Agosto; Limpeza manual de vegetação; Locação de vias e etc.


Constatou-se também que vários da planilha orçamentária Tiveram seus quantitativos aumentados ou suprimidos.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo no valor de **R\$ 22.836,72 (cinte e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)**, equivalente a **10,23% (dez vírgula vinte e três por cento)** do valor contratual.

Segue abaixo o resumo dos serviços a serem executados.

I – SERVIÇOS NOVOS:

- Locação de banheiro químico;
- Locação de container tipo depósito;
- Caixa enterrada hidráulica para drenagem;
- Retirada de esquadrias metálicas(placas, postes metálicas e tampas de pv's);
- Tampa de concreto perfurada;
- Corte de junta;
- Alvenaria;



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração
De: DPP – Divisão de Planejamento

3º ADITAMENTO - PRAZO

**Ref.: TP 012/2020 – Reforma da Pista de Caminhada e Implantação
de Iluminação Pública**
Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli
O.S.: 04/11/2020
Contrato nº 061/2020

Considerando que, a empresa utilizou baixo efetivo para execução dos serviços;

Considerando que, em 18/01/2021 a empresa foi notificada devido à lentidão dos serviços e falta de materiais;

Considerando que, o prazo para encerramento da Ordem de Serviço é 03/04/2021 e o contrato 12/04/2021;

Solicito o aditamento de prazo do contrato e da ordem de serviço para mais 60 dias para não decorrer do prazo de vencimento contratual, ficando os seguintes vencimentos:

- Contrato: 11/06/2021
- Ordem de Serviço: 02/06/2021

São Roque, 18 de Fevereiro de 2021.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração

De: DPP – Divisão de Planejamento

4º ADITAMENTO - PRAZO

**Ref.: TP 012/2020 – Reforma da Pista de Caminhada e Implantação
de Iluminação Pública**

Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli

O.S.: 04/11/2020

Contrato nº 061/2020

Considerando que, a empresa utilizou baixo efetivo para execução dos serviços;

Considerando que, em 18/01/2021 a empresa foi notificada devido à lentidão dos serviços e falta de materiais;

Considerando que, o prazo para encerramento da Ordem de Serviço é 06/06/2021 e o contrato 11/06/2021;

Solicito o aditamento de prazo do contrato e da ordem de serviço para mais 60 dias para não decorrer do prazo de vencimento contratual, ficando os seguintes vencimentos:

- Contrato: 10/08/2021

- Ordem de Serviço: 01/08/2021

São Roque, 19 de Abril de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- Chapisco e emboço;
- Terra vegetal;
- Cabo de cobre de 3x21,5mm;
- Limpeza manual;
- Tubo de pvc dn 150mm;
- Locação de vias.

II – SERVIÇOS COM AUMENTO DE QUANTITATIVOS:

- Caixa de passagem com tampa;
- Demolição mecanizada de sarjeta;
- Forma em madeira;

III – SERVIÇOS COM SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS:

- Escavação manual
- Reaterro compactado;
- Cabo de cobre de 2,5mm²;
- Cabo de cobre de 16,0 mm²;
- Disjuntor bipolar;
- Dispositivo diferencial;
- Remoção de entulho;
- Limpeza manual de terreno inclusive troncos de 5cm;
- Plantio de grama.

As especificações dos itens bem como os preços encontram-se especificados na planilha em anexo.

São Roque, 12 de Fevereiro de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração
De: Planejamento de Meio Ambiente

2º ADITAMENTO

Ref.: TP 012/2020 – Reforma da Pista de Caminhada e Implantação
de Iluminação Pública
Empresa: Santenge Construções e Serviços Eireli
O.S.: 04/11/2020
Contrato nº 061/2020

O contrato n. 061/2020 tem como objeto a contratação de empresa para Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública.

Durante o decorrer da obra constatou-se que diversos itens não constam na planilha orçamentária, tais como canteiro de obras(banheiro químico, container para depósito); Reforma do sistema de drenagem da Av. 16 de Agosto; Limpeza manual de vegetação; Locação de vias e etc.

Constatou-se também que vários da planilha orçamentária Tiveram seus quantitativos aumentados ou suprimidos.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo no valor de **R\$ 22.836,72 (cinte e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)**, equivalente a **10,23% (dez vírgula vinte e três por cento)** do valor contratual.

Segue abaixo o resumo dos serviços a serem executados.

I – SERVIÇOS NOVOS:

- Locação de banheiro químico;
- Locação de container tipo depósito;
- Caixa enterrada hidráulica para drenagem;
- Retirada de esquadrias metálicas(placas, postes metálicas e tampas de pv's);
- Tampa de concreto perfurada;
- Corte de junta;
- Alvenaria;

ITEM " C "



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- Chapisco e emboço;
- Terra vegetal;
- Cabo de cobre de 3x21,5mm;
- Limpeza manual;
- Tubo de pvc dn 150mm;
- Locação de vias.

II – SERVIÇOS COM AUMENTO DE QUANTITATIVOS:

- Caixa de passagem com tampa;
- Demolição mecanizada de sarjeta;
- Forma em madeira;

III – SERVIÇOS COM SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS:

- Escavação manual
- Reaterro compactado;
- Cabo de cobre de 2,5mm²;
- Cabo de cobre de 16,0 mm²;
- Disjuntor bipolar;
- Dispositivo diferencial;
- Remoção de entulho;
- Limpeza manual de terreno inclusive troncos de 5cm;
- Plantio de grama.

As especificações dos itens bem como os preços encontram-se especificados na planilha em anexo.

São Roque, 12 de Fevereiro de 2021.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto										
Endereço: Avenida 16 de Agosto, Junqueira, no Município de São Roque/SP.										
EMPRESA: SANTENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP										
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL				CONTRATO: BDI = 24,23%			ADITIVO: BDI = 24,23%			
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	Quantitativos levantados "in loco"	Diferença de quantidade (levantamento/ contrato)	TOTAL (R\$)
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES				TOTAL DO CONTRATO R\$ 223.208,16			TOTAL GERAL R\$ 22.836,72
1.0.1	PETSR	1.0.1	INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES	UNIDADE	1,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	1,00	0,00	R\$ -
				Sub-Total	1.0	0,1299%	R\$ 290,00			R\$ -
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.0.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra pardão Prefeitura da Estância Turística de São Roque - em chapa de aço galvanizado	M2	3,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	3,00	0,00	R\$ -
				Sub-Total	2.0	0,47%	R\$ 1.050,00			R\$ -
3.0			ABERTURA DE VALA							
3.0.1	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	88,00	R\$ 50,00	R\$ 4.400,00	68,26	-19,74	-R\$ 987,00
3.0.2	CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	86,92	R\$ 6,06	R\$ 526,74	83,88	-3,04	-R\$ 18,42
				Sub-Total	3.0	2,21%	R\$ 4.926,74			-R\$ 1.005,42
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.0.1	CPOS	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	M	550,00	30,00	R\$ 16.500,00	550,00	0,00	R\$ -
4.0.2	CPOS	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	5,00	R\$ 2,20	R\$ 11,00	-	-5,00	-R\$ 11,00
4.0.3	CPOS	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	2.250,00	R\$ 8,00	R\$ 18.000,00	2.200,00	-50,00	-R\$ 400,00
4.0.4	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNIDADE	36,00	R\$ 180,00	R\$ 6.480,00	38,00	2,00	R\$ 360,00
4.0.5	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UNIDADE	36,00	R\$ 40,00	R\$ 1.440,00	36,00	0,00	R\$ -
4.0.6	SINAPI	73767/001	GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM², PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO	UNIDADE	36,00	R\$ 14,83	R\$ 533,88	36,00	0,00	R\$ -
4.0.7	CPOS	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UNIDADE	36,00	R\$ 700,00	R\$ 25.200,00	36,00	0,00	R\$ -
4.0.8	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	36,00	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00	36,00	0,00	R\$ -
4.0.9	PETSR	4.0.9.1	POSTE PADRÃO TRIFÁSICO C-1	UNIDADE	2,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00	2,00	0,00	R\$ -
4.0.10	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UNIDADE	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	-	-1,00	-R\$ 40,00
4.0.11	CPOS	41.11.703	Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W	UNIDADE	36,00	R\$ 1.080,00	R\$ 38.880,00	36,00	0,00	R\$ -
4.0.12	CPOS	37.17.074	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos	UNIDADE	2,00	R\$ 180,00	R\$ 360,00	-	-2,00	-R\$ 360,00
				Sub-Total	4.0	49,64%	R\$ 110.804,88			-R\$ 451,00
5.0			PASSEIO EM CONCRETO							
5.0.1	CPOS	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	40,69	R\$ 175,00	R\$ 7.120,75	41,28	0,59	R\$ 103,25
5.0.2	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m2	664,62	R\$ 13,00	R\$ 8.640,06	664,62	0,00	R\$ -
5.0.3	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	107,15	R\$ 90,00	R\$ 9.643,50	82,50	-24,65	-R\$ 2.218,50
5.0.4	CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m2	208,68	R\$ 65,00	R\$ 13.564,20	211,68	3,00	R\$ 195,00
5.0.5	CPOS	54.01.220	Base de bica corrida	m3	87,51	R\$ 125,00	R\$ 10.938,75	87,51	0,00	R\$ -
5.0.6	CPOS	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m3	70,01	R\$ 700,00	R\$ 49.007,00	70,01	0,00	R\$ -
5.0.7	PMSP	01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA COM REATERRO, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	m3	173,00	R\$ 5,56	R\$ 961,88	173,00	0,00	R\$ -
5.0.8	CPOS	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m2	417,36	R\$ 6,00	R\$ 2.504,16	220,00	-197,36	-R\$ 1.184,16
5.0.9	CPOS	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	417,36	R\$ 9,00	R\$ 3.756,24	220,00	-197,36	-R\$ 1.776,24
				Sub-Total	4.0.11	47,55%	R\$ 106.136,54			-R\$ 4.880,65
TOTAL GERAL							R\$ 223.208,16			

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma da pista de caminhada e implantação de iluminação pública na Avenida 16 de Agosto										
Endereço: Avenida 16 de Agosto, Junqueira, no Município de São Roque/SP.										
EMPRESA: SANTENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP										
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAŁ				CONTRATO: BDI = 24,23%				ADITIVO: BDI = 24,23%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	Quantitativos levantados "In-loco"	Diferença de quantidade (levantamento/contrato)	TOTAL (R\$)
6.11	CPOS	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M²	UNXMES		R\$ 624,90		4,00	4,00	R\$ 2.499,60
6.3	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS DIM. INT. 0,60 x 0,60 x 0,60 PARA REDE DE DRENAGEM	UNID.		R\$ 438,03		15,00	15,00	R\$ 6.570,45
6.10	CPOS	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL	M²		R\$ 22,84		12,00	12,00	R\$ 274,08
	FDE	16.05.048	TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRÉMOLDADA PERFURADA 35cm	UNID.		R\$ 78,94		24,00	24,00	R\$ 1.894,56
6.3	CPOS	11.18.020	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M		R\$ 10,85		425,54	425,54	R\$ 4.617,11
6.4	CPOS	14.02.040	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	M²		R\$ 145,88		7,00	7,00	R\$ 1.021,16
6.5	CPOS	17.02.020	CHAPISCO	M²		R\$ 4,76		7,00	7,00	R\$ 33,32
6.6	CPOS	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M²		R\$ 14,79		7,00	7,00	R\$ 103,53
6.7	CPOS	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M³		R\$ 129,24		29,22	29,22	R\$ 3.776,39
6.13	CPOS	39.24.151	CABO DE COBRE DE 3X1,5mm, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70º	M		R\$ 6,80		180,00	180,00	R\$ 1.224,00
6.14	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA , inclusive retirada de raízes	m²		R\$ 3,36		550,00	550,00	R\$ 1.848,00
6.14	CPOS	46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN = 150mm, INCL. CONEXÕES	M		R\$ 104,81		22,50	22,50	R\$ 2.358,23
6.8	CPOS	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M²		R\$ 1,10		550,00	550,00	R\$ 605,00
				Sub-Total	6.0	0,00%	R\$ -			R\$ 29.173,79
				TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 223.208,16		10,23%	R\$ 22.836,72
								Total Contrato + Aditivo		R\$ 246.044,88

FONTE: SINAPI - Data Base: Agosto/2019 - NÃO DESONERADO
 CPOS - Boletim 176 - L.S. 126.72% - NÃO DESONERADO
 PMSP - Data Base: Julho/2019

São Roque, 23 de Novembro de 2020

RESUMO	VALOR	%
ITENS SUPRIMIDOS	-R\$ 6.995,32	0,00%
ITENS COM ACRÉSCIMOS	R\$ 658,25	0,29%
ITENS NOVOS	R\$ 29.173,79	13,07%
TOTAL	R\$ 22.836,72	13,36%



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração

De: Eng. Pedro Benassi – Departamento de Planejamento

1ª NOTIFICAÇÃO

Ref.: TP – 012/2020

Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública

Empresa: Santenge Construções e Serviços

Data de emissão da Ordem de Serviço: 04/11/2020

Considerando que, o prazo de vigência da obra espira em Fevereiro de 2021;

Considerando que, a obra está com aproximadamente 15% dos serviços executados e foi necessário solicitar um aditamento de prazo para mais 60 dias de obra;

Considerando que, os serviços estão muito lentos, com falta de material e sem previsão para conclusão;

Solicito que a empresa seja notificada administrativamente e com urgência a retomar as atividades em ritmo satisfatório para conclusão do objeto dentro do prazo.

São Roque, 18 de Janeiro de 2021.

ITEM
" E "



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Departamento de Administração

De: Eng. Pedro Benassi – Departamento de Planejamento

2ª NOTIFICAÇÃO

Ref.: TP – 012/2020

Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública

Empresa: Santenge Construções e Serviços

Data de emissão da Ordem de Serviço: 04/11/2020

Considerando que, o prazo de vigência da obra espira em Agosto de 2021;

Considerando que, a obra está com aproximadamente 70% dos serviços executados e foi necessário solicitar aditamentos de prazo;

Considerando que, os serviços parados a mais de 15 dias, desde a concretagem da calçada;

Solicito que a empresa seja notificada administrativamente e **com urgência** a retomar as atividades para conclusão do objeto dentro do prazo.

São Roque, 17 de Maio de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração

solicitação de multa

Ref.: Tomada de Preços nº 012/2020

Assunto: Notificação 016/2021

Empresa contratada: Santenge Construções e Serviços Eireli

O.S.: 04/11/2020

Contrato nº 061/2020

Considerando que, a empresa interrompeu a execução dos serviços sem justificativa, estando a obra parada a mais de 45 dias;

Considerando que, a obra está fisicamente com aproximadamente 80% dos serviços executados, faltando o plantio de grama e a instalação elétrica;

Considerando que, o contrato foi assinado em **14 de Outubro de 2020**;

Considerando que, a cláusula 02.15 do contrato estabelece: *Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12 meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da proposta*;

Considerando que, o contrato não ultrapassou os 12 meses estipulados na cláusula 02.15;

Sendo assim, não concordo com a empresa em atribuir ao reequilíbrio financeiro protocolado em 13/05/2021 de nº003076 2/2 para justificar a obra parada, ou em ritmo lento;

Portanto, solicito que a empresa seja multada em 20% do contrato como estipulado na cláusula 08.17 do contrato à saber *“Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de multa de 20% sobre o valor do contrato”*. Os valores são:

- Valor do contrato: R\$223.208,16

- Valor da multa: R\$89.283,26

Obs.: Segue anexo a solicitação de reequilíbrio financeiro pleiteado pela empresa para análise jurídica.

São Roque, 03 de Junho de 2021.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao,
Departamento de Administração,

SOLICITAÇÃO PARECER jurídico

Ref:

- TP 012/2020 Contrato nº 061/2020
- Objeto: Obras de Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública na Av. 16 de Agosto.
- Empresa: Santenge Construções e Serviços Ltda.

Considerando que, o **Contrato** foi assinado em 14 de Outubro de 2020 e a **Ordem de Serviço** em 04 de Novembro de 2020;

Considerando que, o prazo de entrega da obra é de 90 dias;

Considerando que, em **18 de Janeiro de 2021** foi solicitada a **1ª** Notificação Administrativa devido ao ritmo lento dos serviços, estando a obra com aproximadamente 15% executada;

Considerando que, em **19 de Janeiro de 2021** foi celebrado o **1º** termo Aditamento (Prazo) em mais 60 dias, com as suas devidas justificativas;

Considerando que, em 12 de Fevereiro de 2021 foi solicitado o **2º** Termo de Aditamento (Valor);

Considerando que, em **18 de Fevereiro de 2021** foi solicitado o **3º** Aditamento de Prazo em mais 60 dias, com as devidas justificativas;

Considerando que em **19 de Abril de 2021** foi solicitado o **4º** Aditamento (Prazo) em mais 60 dias, com as devidas justificativas;

Considerando que, em **17 de Maio de 2020** foi solicitada a **2ª** Notificação Administrativa devido à obra estar parada;

Considerando que, em **03/06/2021**, a fiscalização após a análise das justificativas da empresa sobre a obra estar parada, solicitou a penalidade da mesma, pois não apresentou um plano de recuperação e retorno para concluir a obra;

Considerando que, a obra está com aproximadamente **70%** dos serviços concluídos, e todos os serviços executados já foram pagos à empresa;

Sendo assim, solicito um parecer jurídico em relação ao contrato, pois a obra continua parada. Vale salientar que o prazo da Ordem de Serviço expirou em **01/08/2021** e o Contrato em **10/08/2021**

São Roque, 25 de Agosto de 2021.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao
Departamento de Administração

SOLICITAÇÃO CORREÇÃO DO
VALOR DA MULTA.

Ref.: Tomada de Preços nº 012/2020

Assunto: Notificação 016/2021

Empresa contratada: Santenge Construções e Serviços Eireli

O.S.: 04/11/2020

Contrato nº 061/2020

Considerando que, foi solicitada a aplicação de multa para a empresa devido à paralisação dos serviços;

Considerando que o valor solicitado é de 20% sobre o valor total do contrato, sendo este de R\$223.208,16;

Sendo assim informo que, o valor correto da multa a ser aplicada é de R\$ 44.641,63.

São Roque, 01 de Julho de 2021.

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de novembro de 2020 08:24
Para: comercial@santenge.com.br
Assunto: Pista de caminhada
Anexos: Memória de cálculo - Aditivo.xlsx

Bom dia Engº Pedro.

Estou encaminhando a memória de cálculo do aditivo após itens combinados em reunião para sua análise.

Precisamos encaminhar esse aditivo o mais rápido possível.

Fico no aguardo de seu retorno.

Att...



PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SÃO ROQUE
www.saoroque.sp.gov.br

Pedro Benassi

Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

E-MAILS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E O ENGº RESPONSÁVEL.

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 8 de dezembro de 2020 08:39
Para: 'comercial@santenge.com.br'
Assunto: RES: Plataforma

Bom dia Engenheiro.

E com relação aos aditivos do Fórum e da Pista de Caminhada?
E as medições?

Att....

Pedro Benassi
Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: comercial@santenge.com.br [mailto:comercial@santenge.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 16:24
Para: Eng^o Pedro Benassi
Assunto: Fwd: Plataforma
Prioridade: Alta

Boa tarde Eng.º Pedro
Segue em anexo projeto de fundação e estrutura metálica, obra rampa do Fórum, com as alterações acertadas. Qualquer dúvida entre em contato conosco.
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 15:38
Para: 'comercial@santenge.com.br'
Assunto: RES: Memória de Calculo e Quadro Comparativo - Aditivo Obra Pista de Caminhada

Bom tarde Eng. Pedro.

Após visita nas obras hoje, faço as seguintes considerações após a sua solicitação em relação as medições:

1. Rampa do Fórum:

Obra parada. Até o presente momento só foram concretadas as brocas da rampa e da escada, executadas em 21 e 22/12/2020. De lá para cá, mais nada foi executado.

2. Pista de caminhada:

Obra com dois funcionários acertando o piso. Até agora só foram instaladas as caixas de passagem(18 unidades) e os conduites (somente um lado).

Att....

Pedro Benassi
Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: comercial@santenge.com.br [mailto:comercial@santenge.com.br]
Enviada em: domingo, 10 de janeiro de 2021 18:53
Para: Eng^o Pedro Benassi
Assunto: Memória de Calculo e Quadro Comparativo - Aditivo Obra Pista de Caminhada
Prioridade: Alta

Boa tarde Eng.^o Pedro,

Segue em anexo Memória de Calculo Geral / Quadro Comparativo e Memorial Descritivo, para aditivo da obra Pista de Caminhada.

Qualquer duvida me liga.

Atenciosamente:

Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 08:23
Para: comercial@santenge.com.br
Assunto: Memória de cálculo aditamento
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO SERVIÇOS NOVOS.xlsx

Controle:	Destinatário	Ler
	comercial@santenge.com.br	Lida: 17/01/2021 08:34

Bom dia Eng. Pedro.

Estou encaminhando a memória de cálculo do aditivo após análise.
Fico no aguardo de seu retorno, pois preciso o aval do diretor do planejamento para aprovação.
Att....



PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

SÃO ROQUE
www.saoroque.sp.gov.br

Pedro Benassi

Engenheiro Civil

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 16:34
Para: 'comercial@santenge.com.br'
Assunto: RES: Protocolo Cartas sobre Aditivos de obras

Eng. Pedro não esquece de mandar a memória de cálculo por e-mail.

Att...

Pedro Benassi
Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: comercial@santenge.com.br [mailto:comercial@santenge.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 08:58
Para: Eng^o Pedro Benassi
Assunto: Protocolo Cartas sobre Aditivos de obras
Prioridade: Alta

Bom dia Eng^o Pedro,
Segue em anexo cartas solicitando posicionamento quanto ao aditivo das obras:

- Construção de Rampa de Acessibilidade no Fórum de São Roque,
- Reforma da Pista de Caminhada e Implantação de Iluminação Pública na Avenida 16 de Agosto, e
- Reforma da Cobertura do Centro de Convivência do Idoso -CCI.

Estes documentos eram para ser protocolados, no Protocolo Geral da Prefeitura de São Roque, em 25/01/2021, mas o mesmo encontra-se fechado. Desta forma estamos encaminhando a fiscalização da obra.

Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: comercial@santenge.com.br
Enviado em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 11:20
Para: Engº Pedro Benassi
Assunto: Obra Pista de Caminhada - Aditivos
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL - REVISÃO 01 - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx; QUADRO COMPARATIVO - REVISÃO 01 -PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx; MEMORIAL DESCRITIVO ADITIVOS - REVISÃO 01 - PISTA DE CAMINHADA AV. 16 DE AGOSTO.docx

Prioridade: Alta

Bom dia Engº Pedro,
Segue em anexo documentos da obra Pista de Caminhada para sua avaliação e aprovação, após sua revisão nos mesmos na nossa 1ª versão, revisão estas também constando o que foi solicitado reunião da prefeitura em 29/01/2021, as 11:00 hs, com a presença do Diretor de obras, Eng.º Ramon.
Qualquer duvida me liga
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 10:50
Para: 'comercial@santenge.com.br'
Assunto: RES: Obra Pista de Caminhada - Aditivos
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL - REVISÃO 01 - 02-02-21.xlsx

Bom dia Eng. Pedro.
Segue a memória de cálculo após análise.

Att...

Pedro Benassi
Engenheiro Civil
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: comercial@santenge.com.br [<mailto:comercial@santenge.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 11:20
Para: Engº Pedro Benassi
Assunto: Obra Pista de Caminhada - Aditivos
Prioridade: Alta

Bom dia Engº Pedro,
Segue em anexo documentos da obra Pista de Caminhada para sua avaliação e aprovação, após sua revisão nos mesmos na nossa 1ª versão, revisão estas também constando o que foi solicitado reunião da prefeitura em 29/01/2021, as 11:00 hs, com a presença do Diretor de obras, Eng.º Ramon.
Qualquer duvida me liga
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: comercial@santenge.com.br
Enviado em: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021 16:50
Para: Engº Pedro Benassi
Assunto: Fwd: Obra Pista de Caminhada - Aditivos
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL - REVISÃO 03 - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx; QUADRO COMPARATIVO - REVISÃO 03 - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx

Prioridade: Alta

Boa tarde Eng.º Pedro,
Segue documentos aditivo obra Pista de Caminhada, revisão 03, para avaliação e aprovação.
Qualquer duvida me liga.
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

----- Mensagem original -----

Assunto: Obra Pista de Caminhada - Aditivos
Data: 2021-02-02 11:19
De: comercial@santenge.com.br
Para: Engº Pedro Benassi <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>

Bom dia Engº Pedro,
Segue em anexo documentos da obra Pista de Caminhada para sua avaliação e aprovação, após sua revisão nos mesmos na nossa 1ª versão, revisão estas também constando o que foi solicitado reunião da prefeitura em 29/01/2021, as 11:00 hs, com a presença do Diretor de obras, Eng.º Ramon.
Qualquer duvida me liga
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: comercial@santenge.com.br
Enviado em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 08:28
Para: Engº Pedro Benassi
Assunto: Aditivo Obra Rampa do Forum
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL DA OBRA RAMPA FORUM - REVISÃO 01.xlsx;
QUADRO COMPARATIVO RAMPA FORUM - REVISÃO 01.xlsx; MEMORIAL
DESCRITIVO ADITIVOS - OBRA RAMPA DO FORUM - REVISÃO 01.docx;
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO SERVIÇOS CPOS.pdf

Prioridade: Alta

Bom dia Eng.º Pedro,

Segue em anexo Documentos para aditivo da obra do Fórum, com as revisões solicitadas na reunião de 29/01/2021 na prefeitura.

Conforme solicitado pela fiscalização e diretoria de obra da prefeitura na referida reunião, foram adequadas as dimensões das estruturas "Estrutura de Serralheiro", se aprovado será feito a adequação no projeto, "as built".

Estou finalizando a planilha da pista de caminhada com a inserção das caixas de captação de águas pluviais e já te envio.

Qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente:

Pedro Batista Rosa

Comercial Santenge

(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: Pedro Benassi - Planejamento <pbenassi@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 09:07
Para: 'comercial@santenge.com.br'
Assunto: RES: Aditivo Obra Pista de Caminhada
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL - REVISÃO 02 - 11-02-21.xlsx

Bom dia Eng. Pedro.

Segue a memória de cálculo analisada.

Fico no aguardo de seu retorno o mais rápido possível, tanto da pista de caminhada como do Fórum para eu dar prosseguimento no processo de aditamento.

Att...

Pedro Benassi

Engenheiro Civil

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681 | (11) 4784-9671

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: comercial@santenge.com.br [mailto:comercial@santenge.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 11:49

Para: Eng^o Pedro Benassi

Assunto: Aditivo Obra Pista de Caminhada

Prioridade: Alta

Bom dia Eng.^o Pedro,

Segue em anexo documentos relativos a aditamento da obra Pista de Caminhada, para sua avaliação.

Qualquer duvida me liga.

Atenciosamente:

Pedro Batista Rosa

Comercial Santenge

(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: comercial@santenge.com.br
Enviado em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 11:40
Para: Engº Pedro Benassi
Assunto: Aditivo Pista de Caminhada e Rampa Fórum
Anexos: MEMÓRIA DE CALCULO GERAL DA OBRA RAMPA FORUM - REVISÃO 02.xlsx; QUADRO COMPARATIVO RAMPA FORUM - REVISÃO 02.xlsx; MEMORIAL DESCRITIVO ADITIVOS - OBRA RAMPA DO FORUM - REVISÃO 02.docx; MEMÓRIA DE CALCULO GERAL - REVISÃO 05 - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx; QUADRO COMPARATIVO - REVISÃO 05 - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx; MEMORIAL DESCRITIVO ADITIVOS - REVISÃO 05 - PISTA DE CAMINHADA AV. 16 DE AGOSTO.docx

Prioridade: Alta

Bom dia Eng.º Pedro,
Segue documentos aditivo das obras Pista de Caminhada e Rampa Fórum, com as adequações solicitadas.
Qualquer duvida me liga.
Atenciosamente:
Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794

Pedro Benassi - Planejamento

De: comercial@santenge.com.br
Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2021 07:35
Para: Engº Pedro Benassi
Cc: rmalmada@saoroque.sp.gov.br
Assunto: Serviços para acerto nivelamento pisos Pista de Caminhada
Anexos: MEM CALC SERV DEVIDO NIVELAMENTO CORTE TERRENO - PISTA DE CAMINHADA 16 DE AGOSTO.xlsx

Prioridade: Alta

Bom dia Engº Pedro / Eng.º Ramon

Segue planilha composição de serviços para acerto do nível do piso (Calçadas), da pista de caminhada da Av. 16 de Agosto. Conforme reunião na prefeitura de São Roque em 03/03/2021, ficou acertado que executaríamos os serviços descritos na planilha e a Prefeitura forneceria toda a bica corrida.

Qualquer duvida podem me ligar.

Atenciosamente:

Pedro Batista Rosa
Comercial Santenge
(15) 99755-1794
