



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ofício n.º 0086/2020 - DPMA

São Roque, 11 de Novembro de 2020.

Referência: Ofício Vereador nº 810/2020.

Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício em referência, vimos informar que conforme o despacho do Engenheiro Civil Responsável pela obra, os serviços já foram executados.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor

Exmo. Sr.
Etelvino Nogueira
DD Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

OFÍCIO VEREADOR Nº 810/2020

São Roque, 21 de julho de 2020.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimenta-lo e **solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao setor competente, no sentido de providenciar a conclusão da obra de asfaltamento no meio de trecho na Estrada do Caeté (fotos anexas).**

Justifico o presente pedido em razão do alto risco de acidentes, haja vista que a empresa TPD fez o corte no asfalto, dividindo-o ao meio no referido local e abandonou a obra, sendo necessária a sua conclusão.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

EETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Ao
Ilustríssimo Senhor
JOSÉ EDUARDO DAMAS LOUREIRO
MD. Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de São Roque – SP.

PROCOLO Nº CETSRR 21/07/2020 - 08:21 6140/2020
/vtc

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ETELVINO NOGUEIRA:75369940878 em 22/07/2020 12:14:06
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar> e informe o código D0N3-Z0G0-J7N7-C4W0

Este documento é propriedade da Prefeitura Municipal de São Roque e não deve ser utilizado para fins comerciais sem a devida autorização. Qualquer reprodução ou distribuição não autorizada é proibida. O uso indevido deste documento pode acarretar sanções legais. São Roque, SP, 24 de Junho de 2020. ETELVINO WOGUEIRA, Vereador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO VEREADOR Nº 8102020

São Roque, 24 de Junho de 2020.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao setor competente, no sentido de providenciar a conclusão da obra de asfaltamento no meio de trecho na Estada do Café (fotos anexas).

Justifico o presente pedido em razão do alto índice de acidentes, haja vista que a empresa TPJ fez o corte no asfalto, dividindo-o ao meio no referido local e abandonou a obra, sendo necessária a sua conclusão.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

ETEUVINO WOGUEIRA
Vereador


Ao
Ilustríssimo Senhor
JOSÉ EDUARDO DAMAS LOUREIRO
MD, Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura
de São Roque - SP.

PROTÓCOLO Nº 21012020 - 08 24 0102020

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

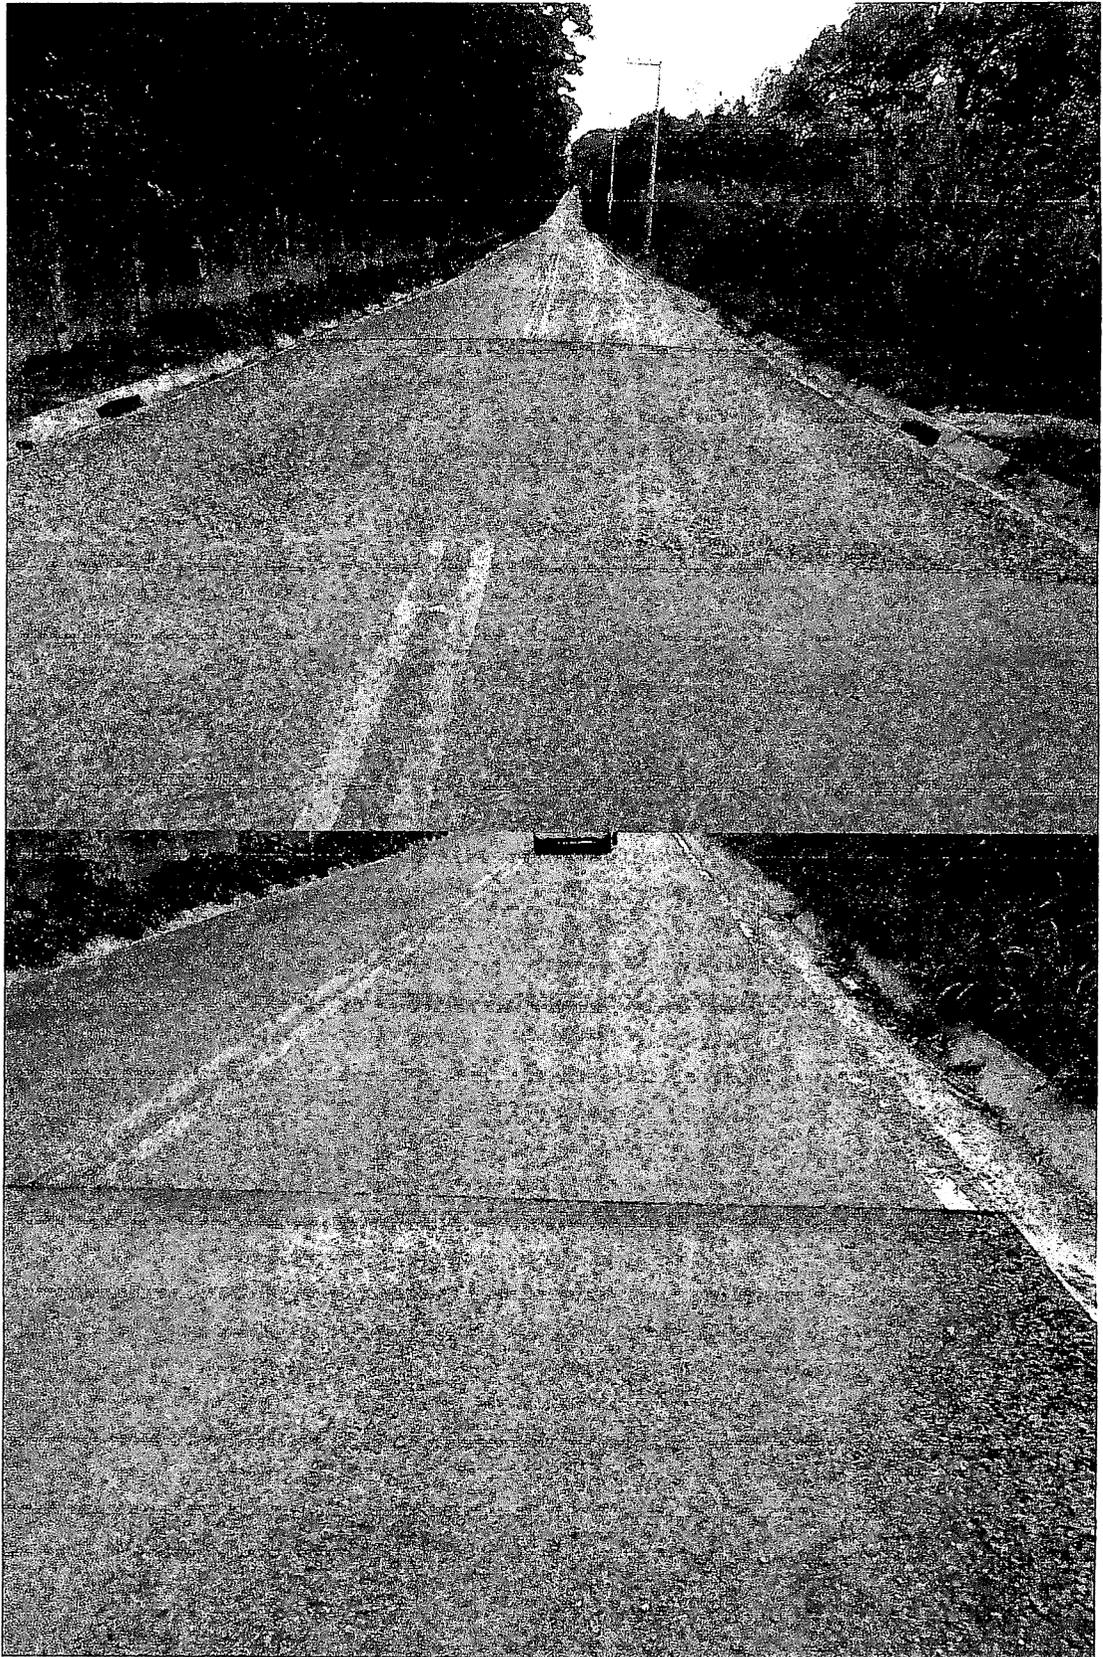


Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ETELVINO NOGUEIRA:75369940878 em 22/07/2020 12:14:06
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar> e informe o código D0N3-Z0G0-J7N7-C4W0

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

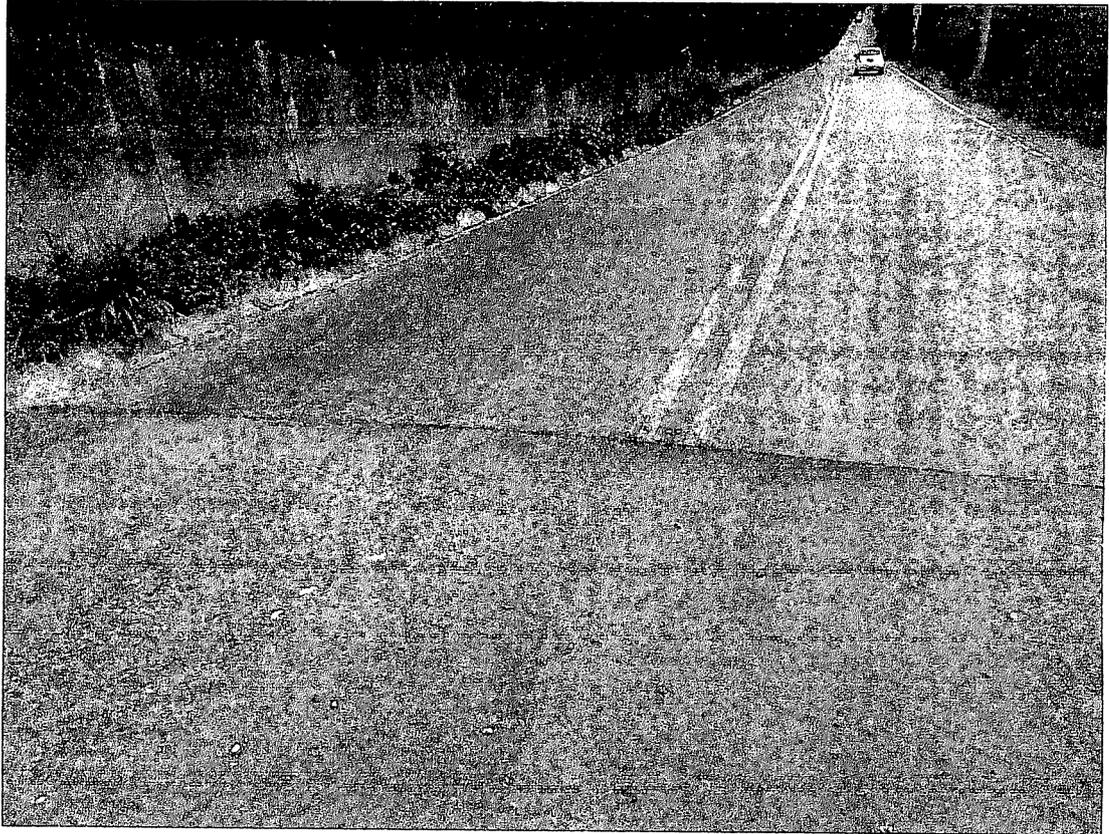


Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ETEL VINO NOGUEIRA:75369940878 em 22/07/2020 12:14:06
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar> e informe o código DON3-Z0G0-J7N7-C4W0

Ao

Eng^o Arthur Boccato
Gerente de Divisões

Favor conhecer e ponderar no
atendimento do solicitado pelo senhor Vereador,
seja pela empresa causadora da situação
ou pelo Depto. de Obras caso a empresa
estaya sub júdice contratual.

 24/07/2020

José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601680758

Ao

Eng^o Pedro,

Favor informar sobre o caso.
Obrigado,

 28/07/2020
Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao Eng^o Arthur - Gerente de Divisões

1. As fotos em questão são referentes ao trecho 1 da Parimen-
tação da Estrada do Lactê.
2. A empresa foi notificada em 03/06/20 para executar os consertos,
a qual apresentou em sua defesa um cronograma para
os consertos.
3. Em 14/07/20 foi encaminhado ao Depto de Administração a solici-
tação de multa pelo descumprimento do cronograma.
4. O processo de multa está em fase de recurso.

Pedro Benassi 29/07
Engenheiro Civil 2020
CREA: 0682153909

Ao

Diretor do Depto. de Planejamento.

Eng^o José Eduardo,

Segue resposta do Eng^o Pedro (fiscal
da obra).

Atenciosamente,

Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

30/07/2020

Ao

G.P.

A/C Sr. Marcelo Marques

Chefe de Gabinete

Favor conhecer e nos orientar sobre
procedimentos.

Assinatura: 31/07/2020

José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

Ao

Departamento Jurídico,

O enge. Pedro informou que a empre-
sa foi notificada em 03/06/2020 para executar
os consertos.

A obra/serviço está na garantia.

Posto isto, pode a Prefeitura assumir
o reparo da obra que está notificada?

A Assessores


D.º Fabiano

Paço para

M.º

G.P., 04/08/2020


Marcelo Marques da Silva
Chefe de Gabinete


Rafael Alexandre Bonino
Assessor Consultor
OAB/SP nº 187.734

AO Departamento de Planejamento

Soluto informar o andamento
das despesas do contrato sem como
a sua siginca


SR. 27/08/2020


Fátima Marson Fernandes
OAB/SP 196.742

AO

Engº Arthur Prociato
Gerente de Missões

Favor atender a solicitação
da Dra. Fátima M. Fernandes - Depto.
Jurídico.


Data: 31/08/2020
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

À

Eng^o Pedro Benassi,

Favor atender a cota da Dra. Fabiana,
Obrigado,


A. 01/09/2020
Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


Para: Eng. Arthur – Gerente de Divisões

Segue abaixo as respostas referente ao solicitado pela Dr^a Fabiana.


Fase 1 da Pavimentação da Estrada do Caetê:

1. A empresa irá executar os consertos em conjunto com a pavimentação do 2º trecho da fase 2 da Estrada do Caetê;
2. Esta previsto para a segunda semana de setembro de 2020, conforme justificativas e programação apresentadas no processo 4039/2020

São Roque, 03 de Setembro de 2020.



Pedro Benzaei
Engenheiro Civil
CREA: 0252153900



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


Para: Eng. Arthur – Gerente de Divisões

Segue abaixo as respostas referente ao solicitado pela Dr^a Fabiana.

Fase 2 da Pavimentação da Estrada do Caetê:

1. A empresa retomou a obra e pavimentou o 1º trecho em 14/08/2020;
2. Não conseguiu dar continuidade devido as fortes chuvas na última semana de agosto, tendo que desmobilizar todos os equipamentos e pessoal;
3. O Eng. Luciano tentou reprogramar os serviços para a última semana de agosto, mas não teve êxito devido às programações da usina e da equipe de pavimentação estarem comprometidas;
4. Conforme cópia do e-mail de 01/09/2020, podemos verificar que a empresa conseguiu programar para a segunda semana de setembro de 2020 a pavimentação do 2º trecho;
5. Para conclusão da obra com a pintura, muro de pedra, instalação de placas e canaletas o Engenheiro prevê até o dia 18/09/2020.

São Roque, 03 de Setembro de 2020.



Engenheiro Arthur
Gerente de Divisões
03/09/2020

Pedro Benassi - Planejamento

De: Luciano Acácio <lracacio@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 1 de setembro de 2020 15:01
Para: pbenassi@saoroque.sp.gov.br
Assunto: Retomada da Pavimentação Estrada Caetê - fase 2

Boa tarde Pedro!

Sobre a retomada da obra de pavimentação da segunda etapa na Estrada do Caetê, segue algumas justificativas por ainda não termos iniciado:

Em função das chuvas que ocorreram a duas semanas atrás, os serviços que já estavam preparados para a continuação da pavimentação foram perdidos em parte e, era necessário um período de estiagem para refazê-los, como marcação e limpeza de canaletas, limpeza e desobstrução de caixas.

Esses serviços foram retomados em parte na semana passada e continuam nesta semana, inclusive também com a conclusão do muro de pedras, que mudamos a execução para antes do asfalto.

Toda a equipe e maquinários também foram desmobilizados. Também já estou providenciando para o retorno da equipe para reparar alguns pontos que a chuva estragou e então espalhar a massa asfáltica.

A retomada dos serviços de acerto e espalhamento de BGS, pintura de impermeabilização e cola e lançamento do asfalto, está previsto para próxima semana, após o feriado.

Estou empenhado e acompanhando para tentar reduzir esses prazos mais, por hora, é o que tenho programado com as equipes, tanto de execução, quanto dos maquinários e equipamentos quanto da usina de asfalto também.

Abraço
Luciano Acácio



Livre de vírus. www.evasi.com

Ao

Eng.º Pedro Benassi;

Favor informar se os problemas foram solucionados com o reparo da via em questão.


Obrigado,


Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

30/09/2020

Ao, Eng. Arthur.

Sim, os problemas foram corrigidos.


Pedro Benassi
Engenheiro Civil
CREA: 0932153909

30/09/20.

Ao

Diretor do Dept. de Planejamento.

Eng.º José Eduardo,

Conforme informado pelo Eng.º Pedro, os problemas foram corrigidos.

At.te,


Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

01/10/2020



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Eng.º Arthur Bocato
Gerente de Divisão

Favor informar o solicitado pelo
Departamento Jurídico em termos contratuais.

Podemos dar por encerrado e
atendido o ofício bem como afirmar que
os serviços foram realizados a contento?

Jose Eduardo Damas Loureiro
01/10/2020

Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758

Ao

Eng.º Pedro Benassi,

Favor responder ao questionado.

Obrigado,

Arthur Henrique Silva Bocato
15/10/2020
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

Arthur,

Os consertos da fase 1 da pavimentação da Estrada do Lote 1 está concluída.



Pedro Benassi
Engenheiro Civil
CREA: 0292153909

15/10
2020

Ao

Diretor do Depto. de Planejamento.

Jose Eduardo,

Conforme informado pelo Engº Pedro,
os consertos da fase 1 foram concluídos.

At.te,




16/10/2020
Arthur Henrique Silva Boccato
Gerente de Divisões - GDP
CREA n.º 5061874464

À

Sra. Daiane Moraes

Chefe Serv. Plan.

Favor ao senhor vereador, requerente,
que os serviços foram realizados.



16/10/2020
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA N.º 0601660758
