

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

SISTEMA SEGURANÇA	SUBSISTEMA ITENS DE SEGURANÇA
ITEM INSPECIONADO MANGUEIRA HIDRANTE	DATA E HORA DA INSPEÇÃO 21/01/2025
CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	

ANOMALIAS

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA: Mangueiras Hidrante
Fazer teste Hidrostático nas Mangueiras
Quantidade: 04 Mangueiras tipo 2

IMAGENS



FIGURA 1.Mangueira Hidrante

SISTEMA SEGURANÇA	SUBSISTEMA ITENS DE SEGURANÇA
ITEM INSPECIONADO EXTINTORES	DATA E HORA DA INSPEÇÃO 21/01/2025
CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	

ANOMALIAS**DESCRIÇÃO DA ANOMALIA:** Extintor vencidoRecarga : 03 Extintores CO²

10 Extintores Água

09 Extintores Pó Químico BC

IMAGENS**FIGURA 2.EXTINTOR VENCIDO**

SISTEMA SEGURANÇA	SUBSISTEMA ITENS DE SEGURANÇA
ITEM INSPECIONADO EXTINTORES	DATA E HORA DA INSPEÇÃO 21/01/2025
CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	

ANOMALIAS

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA: Extintores instalados de maneira incorreta. Extintores devem ser instalados abaixo das placas de sinalização altura de 1,50m do piso ou em suporte de chão.

IMAGENS

FIGURA 3. Extintores instalados de forma incorreta.

SISTEMA SEGURANÇA	SUBSISTEMA ITENS DE SEGURANÇA
ITEM INSPECIONADO PLACA DE SINALIZAÇÃO	DATA E HORA DA INSPEÇÃO 21/01/2025
CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	

ANOMALIAS**DESCRIÇÃO DA ANOMALIA:** Falta Placa de Sinalização

Instalar 07 Placas extintor tipo Água (A)
07 Placas extintor tipo Pó Químico (BC)
03 Placas extintor CO²
04 Placas Botoeira (bomba de incêndio)
04 Placas Hidrante
10 Placas Rota de Fuga
01 Placa descida
04 Placas alarme de incêndio

IMAGENS**FIGURA 4.FALTA PLACA DE SINALIZAÇÃO**

SISTEMA	SUBSISTEMA
SEGURANÇA	ITENS DE SEGURANÇA
ITEM INSPECIONADO	DATA E HORA DA INSPEÇÃO
ENCAMINHAMENTO DOS HIDRANTES	21/01/2025
CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO	
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	

ITENS A SEREM INSTALADOS:

Devido ao novo traçado da tubulação sera necessario a compra e instalação dos seguintes itens:


- 42,10m Tudo em Aço Galvanizado, 2.1/2"
- 12 Curvas 90° de Aço Galvanizado, 2.1/2"
- 01 Bomba de Incendio, 10CV, 2.1/2"

OBS: O Caminhamento da tubulação de alimentação dos hidrantes devera ser instalado de acordo com o isometrico em planta.

IMAGENS



- Modelo da forma de instalação dos equipamentos

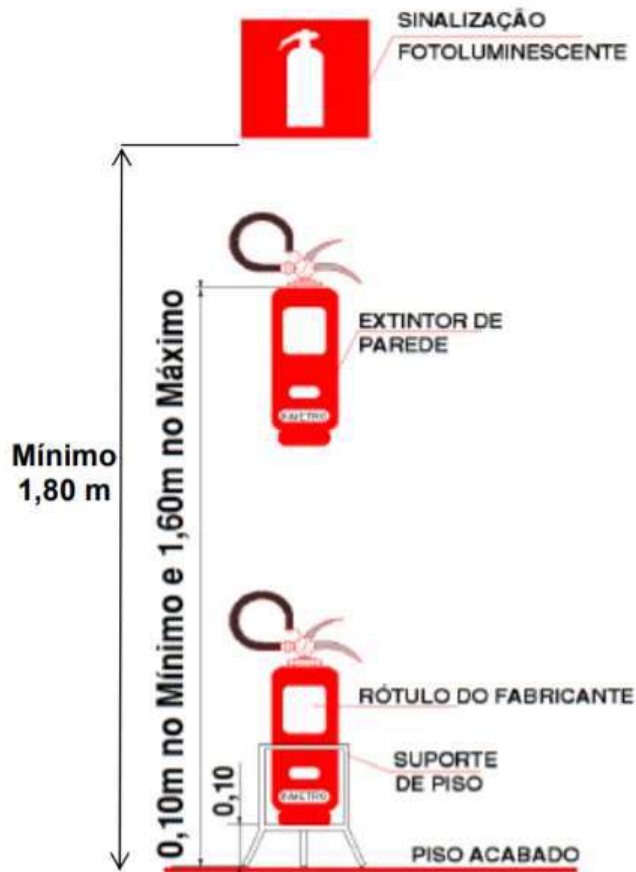

São Paulo, 12 de Fevereiro de 2025

Flavio Antonio Candido
Engenheiro Responsável
Crea: 5069408602- SP
